



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共財政事務跟進委員會

第 4/VII/2023 號報告書

事由：跟進《二零二二財政年度第四季度投資計劃預算執行報告》

一、 引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2021 年 11 月 19 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2021 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”
4. 委員會履行本身職責，於 2023 年 3 月 28 日召開會議以跟進《二零二二財政年度第四季度投資計劃預算執行報告》。會

羅
七
學
林
孔
廣
夏
張



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單。

5. 政府於 2023 年 5 月 10 日就委員會所提出的問題提供了回覆。
6. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。

二、 跟進情況

7. 就委員會向政府提出的問題和政府的回覆，僅扼要轉述有關內容。
8. 按照政府對「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」項目的執行進度說明，因疫情影響，致使“為澳門大賽車博物館參觀體驗實施資訊及多媒體展項的內容製作和購置設備服務”第四期支付須延至 2023 年支付，委員會要求政府詳細說明有關延誤的原因，尤其具體的延誤時間，以及該項服務的延誤有否影響現時公眾參觀澳門大賽車博物館的體驗。另外，在執行進度說明中亦表示，因港幣匯率的原因，致使項目的預算金額需要修正，委員會亦要求政府詳細說明相關原因。
9. 政府回覆：

就有關“為澳門大賽車博物館參觀體驗實施資訊及多媒體展項的內容製作和購置設備服務”之第四期支付須延至 2023 年支付，主要是由於之前一直受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響及入境澳門防疫措施的限制，導致題述服務被判給人的海外製造商及技術人員未能於疫情期間抵澳完成服務。因應 2023 年年初，本澳已取消對持外國護照入境人士的特別限制措施，按現行工作計劃，餘下的格電模擬器展項將預計於本年第二季推

梁林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

出。基於澳門大賽車博物館將會恆常及分階段推出各類不同展項及參觀元素以豐富參觀者的體驗，故有關服務的延誤並不會影響公眾參觀體驗。

另外，茲因“為澳門大賽車博物館參觀體驗實施資訊及多媒體展項的內容製作和購置設備服務”是由設於香港之公司承攬，旅遊局需透過匯款方式支付費用予獲判給公司；然而，在判給預留階段，旅遊局以1港元兌1.032澳門元預留款項，但因應銀行以1港元兌1.0315澳門元之匯率進行匯款，過往年度實際支付金額較預留款項時少，故旅遊局在修訂跨年度負擔時一併調整已完成支付之預留金額，以致需對項目之預算金額作出修正。

10. 「嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道」項目預算使用率為零，此外，按照政府提供的項目目的說明，上述項目應為一研究項目。然而，從項目名稱未有反映有關事實，且該項目亦納入“路橋、山坡及航道”項目群內。為此，委員會要求政府釐清有關項目的性質及目前該項目的相關工作進度詳細資料及計劃節點。

11. 政府回覆：

該項目包括專題研究、工程勘探及初步設計，目前項目已完成工程勘探及專題研究工作，但鑑於該項目澳門段出入口鄰近位於孫逸仙大馬路、城市日大馬路交匯點需與其他項目建設進行協調交通規劃安排，加上該海底隧道原規劃的一落腳點D區填海工程的不確定，並未開展初步設計，待D區情況明確或研究在氹仔端另覓地點為新落腳點才可進行下一階段的初步設計工作，因此暫緩該項目。勘察及專題研究判給金額澳門元99,270,000.00元，已支付費用澳門元24,817,500.0元，現按已提供的服務進行結算中。

梁林仁



梁
卓
村
任
青
鳳
張

12. 按照政府在 2022 年第三季度「投資計劃」問題清單的回覆，「地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程」項目因考慮到預算、觀測站搬遷的複雜性和激光雷達實驗室建造的不確定性，決定不擴建大潭山觀測站，取消有關計劃和程序。然而，在第四季度的執行進度說明中，卻表示須重新審核方案及作或有之估算調整，現階段不作判給。兩者說明並不一致，為此，委員會要求政府釐清上述項目的具體狀況。

13. 政府回覆：

擴建地球物理暨氣象局觀測站設計連建造工程於 2022 年 6 月 2 日進行詢價，2022 年 8 月 9 日（第三季）開標，由於收到的標書投標額均高於預算，公共建設局技術員對各標書分析後，認為需對工程重新審視方案及作或有之估算調整，故此是次詢價招標不作判給，並於 2022 年 10 月 7 日（第四季）再對工程重新招標，然而於招標期間，地球物理暨氣象局於 2022 年 11 月 1 日透過公函表示經考慮到預算、觀測站搬遷的複雜性和激光雷達實驗室建造的不確定性，決定不擴建大潭山觀測站，因此，有必要取消是次詢價招標。

14. 委員會關注「澳門人工島污水處理設施建造」項目及「焚化中心第三期設施建造」項目的執行狀況，為此，要求政府提供最新進度詳細資料，以及整個項目的工作計劃節點資料。

15. 政府回覆：

「澳門人工島污水處理設施建造」項目

環境保護局就澳門人工島污水處理設施項目已完成處理工藝技術評估、初步設計、環境影響評估等前期工作，其後開展編製



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

投標案卷。同時於 2019 年開始拆卸澳門半島污水處理廠已停用的污泥焚化爐，以騰出空間用作建造人工島污水處理廠的預處理設施及深層污水輸送管的連接口。隨後，因應港珠澳大橋澳門口岸管理區的最新發展佈局規劃，以及配合中水回用的發展工作進展，對人工島污水處理設施的初步設計進行了相應調整。原預計於 2022 年進行工程公開招標，惟受疫情影響工作進度。環境保護局爭取在 2023 年開展公開招標及完成判給程序。

「焚化中心第三期設施建造」項目

焚化中心第三期設施建造工程於 2020 年 5 月下旬開展，2022 年完成了新變電站土建工作、新行政樓主體結構，以及新特殊和危險廢物處理站的建造並投入試運行階段，至 2023 年第一季度正進行第三期焚化廠上部結構施工，預計於 2024 年下半年試運行，本項目的主要工作計劃節點過半已完成。惟受疫情影響，導致現場施工及國內大型設備生產進度受阻，令項目整體進度持續受到影響。

16. 截至 2022 年第四季度，「樂群樓中央燃氣系統改造工程」項目的預算執行率仍為零，而該項目是為解決樂群樓的燃氣管道存在腐蝕及燃氣洩漏的安全隱患。委員會關注樂群樓燃氣管道已使用的時間、出現安全隱患的原因，以及執行進度。
17. 政府回覆：

按照原計劃，相關工程的公證合同簽署預計於 2022 年 10 月份完成，待簽署公證合同後，承建商隨即開展本工程的設計連改造工作，預計 2022 年度內向承建商支付澳門元 330,000.00 元，約佔合同總金額的 1.1%。惟承建商按 11 月 8 日第 74/99/M 號法令第 97 條規定，於 2022 年 9 月 30 日向房屋局就合同擬本提

梁林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

出異議，經跟進及處理異議，承建商最終於 2022 年 11 月 18 日向房屋局提交確定擔保，以及於合同擬本中簽名確實。房屋局隨即跟進簽署公證合同的工作，並於 12 月 29 日完成公證合同簽署，於 2022 年 12 月 30 日完成委託工程筆錄簽署，但最終未能按計劃於 2022 年開展工程，故於 2022 年度該工程項目的預算執行率為零。

樂群樓於 2011 年開展施工，至 2013 年完工移交使用。根據當時採用的燃氣設施技術規章，燃氣管道採用無縫鋼管，嵌入式管道不需要防腐蝕塗層。但其後發現嵌入於磚牆中的管道受水氣或其他含氯/硫的液體鏽蝕，導致有漏氣的情況，因此，須進行改造工程。

18. 按照政府提供的說明，因澳門半島與 A 區之間水道填海的不確定，「外港堤圍優化工程」項目計劃與設計單位解除合同。就解除合同之事，委員會關注政府是否需要支付任何款項，倘需要，相關金額及需要支付款項的原因。

19. 政府回覆：

由於新城 A 區規劃調整優化，澳門半島與新城 A 區之間將進行填土規劃，以增加公共開放及綠化空間，有關填土之範圍與“外港堤圍優化工程—編製工程計劃”之設計範圍重疊，將改變外港堤圍的現存環境條件，因此暫緩本項目；鑑於上述情況，特區政府計劃將與設計單位協議解除合同，編製工程計劃判給金額澳門元 11,553,740.00 元，已支付費用澳門元 6,932,244.00 元，政府仍需支付設計單位已執行的防洪評價、現場地形測量及地質勘探服務部分之費用，目前尚在結算中。

20. 近年受疫情影響，政府編製預算時採用緊縮開支措施，為此，委員會希望了解政府作出開支支付的準則，尤其當工程項目的

梁
林
任
夏
陳



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

進度理想，符合支付條件的金額高於編製預算開支所登錄的金額時，政府採用何種方式處理有關情況。

21. 政府回覆：

公共工程在判給時，會根據招標文件中的支付計劃及施工進度計劃等，作為編製分年度支付計劃的依據，而在工程委託後，政府會要求承建商，按照已批核的施工計劃及實際施工進度進行評估，經監察實體和工料測量單位審核後再進行本年度之預算分析覆核。

在疫情期間，政府編製預算時採用緊縮開支措施，基本是按項目之重要性，以輕重緩急準則編列項目之預算，倘出現工程項目的進度理想，符合支付條件的金額高於判給時所編製預算作登錄的金額，會有 2 種處理方式：

- (1) 按照預算開支所登錄的金額支付，不足之款項則待下一個財政年度支付，但承建商仍有責任繼續投放資金進行工程。
- (2) 修改預算，考慮由同屬一項目群中有預算盈餘的項目作出財政調撥。

三、 財政分析

22. 2022 年的「投資計劃」最初預算為 183.2 億澳門元(以下簡稱為元)，截至第四季度的經核准預算為 189.6 億元，較最初預算增加 6.4 億元，實際開支為 159.5 億元，預算執行率為 84.1%，預留金額為 160.8 億元，預算使用率為 84.8%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。

莫
林
任
承
承



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

23. 2022 年第四季度「投資計劃」與 2022 年第三季度「投資計劃」比較，經核准預算增加 4.3 億元，實際開支增加 53.3 億元，預留金額增加 3.8 億元，預算執行率上升 26.8%，預算使用率則上升 0.1%。

2022 年	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	百萬澳門元	
					預算 使用率	項目數
第四季	18,958	15,952	16,077	84.1%	84.8%	230
第三季	18,525	10,622	15,700	57.3%	84.7%	223
變化	432	5,330	378	26.8%	0.1%	7

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

24. 此外，截至第四季度「投資計劃」共有 230 個項目，較第三季度的 223 個項目增加 7 個。在 2022 年第四季度期間新登錄的 7 個項目中，其中兩個項目分別是在 2017 年及 2019 年已立項的舊項目，另外 5 個則是在 2022 年第四季度新設立的項目，該 7 個新登錄的項目合共涉及 3,027 萬元的預算。

環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成 日期
澳門污水處理廠升級工程 II	547,840.00	舊項目	226,691,654.42	2017-04 2024-07
內港南臨時污水處理設施建造工程	1,000,000.00	新項目	87,600,000.00	2022-09 2025-12

吳
七
星
林
能
黃
王
輝



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

澳門大學

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
澳門大學-N23 科研大樓 G016 課室設計及建造工程	3,873,106.50	舊項目	7,746,306.50	2019-07 2023-12

房屋局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
樂群樓中央燃氣系統改造工程	330,000.00	新項目	31,211,500.00	2022-12 2026-12

運輸工務司司長辦公室

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
路環九澳高頂馬路擴闊工程	1,626,300.00	新項目	48,122,000.00	2022-11 2025-12

廉政公署

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
新口岸填海區 Q-1D 地段公共辦公大樓	4,040,000.00	新項目	842,770,000.00	2022-09 2027-12

梁林
任青
區



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

財政局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
《智慧財政》第二階段	18,849,600.00	新項目	85,720,000.00	2022-12 2024-12

25. 2022年第四季度的經核准預算較2021年同期增加48.7億元，實際開支增加20.6億元，預留金額增加20.4億元，預算執行率下降14.5%，預算使用率亦下降14.9%，「投資計劃」的項目數量則減少了23個。

26. 值得注意的是，2022年第四季度的預算執行率及預算使用率與2021年同期比較，有較明顯的下降，這是因為2021年第四季度政府從「投資計劃」預算註銷了45億元的預算，致使2021年第四季度的預算執行率達98.6%及預算使用率達99.7%。

第四季	百萬澳門元					
	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2022年	18,958	15,952	16,077	84.1%	84.8%	230
2021年	14,083	13,888	14,037	98.6%	99.7%	253
變化	4,875	2,065	2,040	-14.5%	-14.9%	-23

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

梁
林
任
黃
張



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

27. 2022 年第四季度預算使用率為零的項目共有 13 個，較第三季度減少 16 個，涉及經核准預算約 2.4 億元(詳細資料可參閱附件三)：

部門	第三季	第四季
土地工務局	1	2
文化局	2	1
司法警察局	3	1
市政署	2	2
行政公職局	1	0
房屋局	1	1
旅遊局	0	1
海事及水務局	1	0
博彩監察協調局	1	0
運輸工務司司長辦公室	2	0
衛生局	1	1
澳門大學	5	0
澳門保安部隊事務局	3	1
澳門旅遊學院	1	1
澳門特別行政區海關	1	0
環境保護局	2	1
警察總局	2	1
合計	29	13

28. 在 13 個預算使用率為零的項目中，建議部門為土地工務局及市政署的項目最多，各占 2 個。另外，該 13 個預算使用率為零的項目，有 9 個項目是在 2022 年重新登錄的舊項目，然而，截至 2022 年第四季度，這 9 個重新登錄的舊項目的預算使用率仍為零，涉及的經核准預算約為 1.9 億元。

梁榮林
任清
張



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
土地工務局	嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道	29,781,000.00	2018-12	2025-12
土地工務局	地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程	10,339,375.56	2021-05	2022-12
文化局	澳門文學館	49,500.00	2016-01	2022-06
房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	1,132,513.00	2019-01	2026-12
旅遊局	高美士街旅遊活動中心重修及購置設備	4,006,000.00	2014-01	2023-12
澳門保安部隊事務局	為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛	14,188,900.00	2019-08	2023-12
澳門旅遊學院	旅遊學院氹仔新校區完善工程	16,150,000.00	2016-12	2025-12
環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	108,059,400.00	2015-02	2028-08
警察總局	智慧民生	2,100,000.00	2020-01	2023-12
合計		185,806,688.56		

29. 此外，尚有兩個預算執行率為零的項目，該兩項目已登錄了預留款項，但最終未能在 2022 年作出支付，該兩項目分別為：

建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
土地工務局	外港堤圍優化工程	3,896,000.00	2018-02	2025-12
房屋局	樂群樓中央燃氣系統改造工程	330,000.00	2022-12	2026-12

30. 按照政府提供的說明，「外港堤圍優化工程」項目，基本計劃已批核，需待完成“澳門內港擋潮閘工程實時數字仿真驗證”總結報告及輕軌東線灘塗整治方案確定後，再繼續“外港堤圍

梁林任貴



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

優化工程- 編製工程計劃”的施工計劃之後續工作，因澳門半島與 A 區之間水道填海的不確定，計劃將與設計單位解除合同。「樂群樓中央燃氣系統改造工程」項目，因設計連改造工程之承攬人對合同擬本提出異議，導致需執行額外的行政程序，故未能支付首期費用。

31. 另外，截至 2022 年第四季度，將經核准預算與最初預算比較，「投資計劃」中有 60 個項目的經核准預算較最初預算減少（包括 2 個已取消立項的項目）；88 個項目的經核准預算則與最初預算一致；此外，有 84 個項目的經核准預算較最初預算增加，當中包括 23 個在編製 2022 年度「投資計劃」最初預算後才增加的項目，詳細資料可參閱附件四。

32. 經核准預算與最初預算變動金額超過 5,000 萬元的項目共計有 9 個，當中 5 個項目是增加預算金額，而另外 4 個則為減少預算金額，如下表所示：

運輸工務司司長辦公室

項目名稱	最初預算	經核准預算	差額	變動
輕軌東線項目	440,356,000.00	102,119,590.00	-338,236,410.00	-76.8%
輕軌行車物料及系統	436,759,700.00	301,759,700.00	- 135,000,000.00	-30.9%
大潭山隧道	100,000,000.00	2,783,900.00	-97,216,100.00	-97.2%
澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程	550,950,000.00	603,772,320.60	52,822,320.60	9.6%

梁林仁



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

項目名稱	最初預算	經核准預算	差額	變動
澳氹第四條跨海大橋	839,442,600.00	1,245,761,600.00	406,319,000.00	48.4%
澳門輕軌延伸橫琴線	1,079,539,100.00	1,603,928,696.79	524,389,596.79	48.6%

環境保護局

項目名稱	最初預算	經核准預算	差額	變動
廚餘集中處理設施	144,790,000.00	85,828,867.00	-58,961,133.00	-40.7%
焚化中心第三期設施建造	450,000,000.00	524,491,605.20	74,491,605.20	16.6%

澳門特別行政區海關

項目名稱	最初預算	經核准預算	差額	變動
港珠澳大橋澳門跨境貨物轉運站	7,137,000.00	68,753,000.00	61,616,000.00	863.3%

33. 此外，委員會關注的「澳門新監獄 - 興建工程」項目於第四季的執行狀況為如下：

經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	經修改後項目預算
504,473,343.12	226,270,574.64	226,390,041.31	44.9%	2,481,154,803.61

梁林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

34. 從政府提供的說明可推斷，預算執行率偏低，主要是第三期主體工程」的進度較預期慢所致，政府原先預計在 2022 年須支付約 4.1 億元¹，但實際支付僅約 2.3 億元。
35. 截至 2022 年第四季度，政府預計「澳門新監獄 - 興建工程」項目的項目預算金額為 24.8 億元，低於早前政府回覆委員會時所述的 27.3 億元。

四、 意見和建議

36. 截至 2022 年第四季度，「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 84.1%和 84.8%，整體進度尚算理想，委員會對此表示肯定。
37. 有關「嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道」項目的執行狀況，按照政府的補充說明，該項目將待 D 區填海工程明確後，才再研究落腳點，委員會十分關注有關項目的規劃，為此，將持續跟進該項目的後續情況。
38. 此外，有關「樂群樓中央燃氣系統改造工程」項目的進度，按照政府的補充說明，現有燃氣管道有漏氣的情況，但因設計連改造工程之承攬人對合同擬本提出異議，導致需執行額外的行政程序，仍未能按計劃於 2022 年開展工程；回覆中亦未說明項目開展時間。為此，委員會亦非常關注項目的執行進度，將適時作出跟進。
39. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

¹ 參考公共財政事務跟進委員會第 2/VII/2023 號報告書第 8 頁，表【2022 年預計作出支付及未有條件作出支付金額】

李林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

五、 總結

40. 委員會總結如下：

- (1) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- (2) 將本報告書送交特區政府。

二零二三年六月二十三日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)

陳澤武

梁林紅



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

92

李

邱庭彪

龐川

林倫偉

林倫偉

梁鴻細

梁鴻細

張健中

張健中

羅彩燕

羅彩燕

李良汪

李良汪



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件一

行政當局投資與發展開支計劃 二零二二財政年度第四季度 預算執行報告

冼
七
學
林
任
青
區
珍

行政當局投資與發展開支計劃
二零二二財政年度第四季度
預算執行報告



此頁留空

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二二年第四季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

第一部份

二零二二年「投資計劃」的最初預算為澳門元 183 億 2,099 萬元，經核准後預算為澳門元 189 億 5,781 萬元，實際開支為澳門元 159 億 5,208 萬元，預算執行率為 84.1%¹，預留金額為澳門元 160 億 7,734 萬元，預算使用率為 84.8%²。

按項目群分，預算金額最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群，經核准後預算為澳門元 42 億 341 萬元，實際開支為澳門元 36 億 1,011 萬元。當中「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 26 億 8,947 萬元，實際開支為澳門元 26 億 8,714 萬元，預留金額為澳門元 26 億 8,887 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.9% 及約 100.0%。其次為「離島醫療綜合體中央化驗大樓」，經核准後預算為澳門元 6 億 8,647 萬元，預算執行率及使用率皆為 99.9%。

按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 64 億 1,059 萬元，佔整體預算的 33.8%，預算執行率及使用率分別為 90.8% 及 91.9%。其次為衛生局及房屋局，衛生局的經核准後預算為澳門元 48 億 8,755 萬元，佔整體預算的 25.8%，預算執行率及使用率分別為 86.7% 及 86.9%；房屋局的經核准後預算為澳門元 18 億 7,701 萬元，佔整體預算的 9.9%，預算執行率及使用率分別為 94.4% 及 94.8%。


按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 76 億 3,945 萬元，佔整體預算的 40.3%，預算執行率及使用率分別為 85.7% 及 86.3%。當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 54 億 1,084 萬元，佔整體預算的 28.5%，預算

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算


執行率及使用率分別為 87.2 % 及 88.0%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

按經濟分類的經核准後預算分配

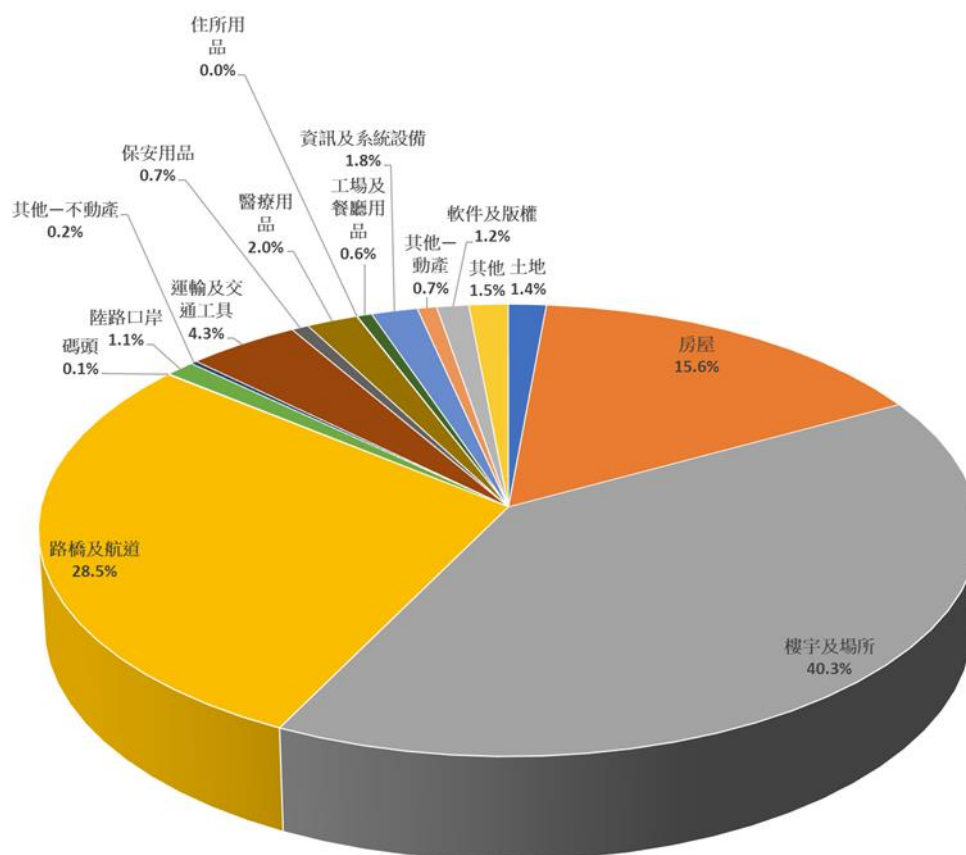

按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 82 億 9,070 萬元，佔整體預算的 43.7%，預算執行率及使用率分別為 85.1% 及 85.7%。當中主要包括「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。其次為「衛生」，其經核准後預算為澳門元 48 億 7,277 萬元，佔整體預算的 25.7%，預算執行率及使用率分別為 87.4% 及 87.7%，當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」等項目。

按功能分類的經核准後預算分配

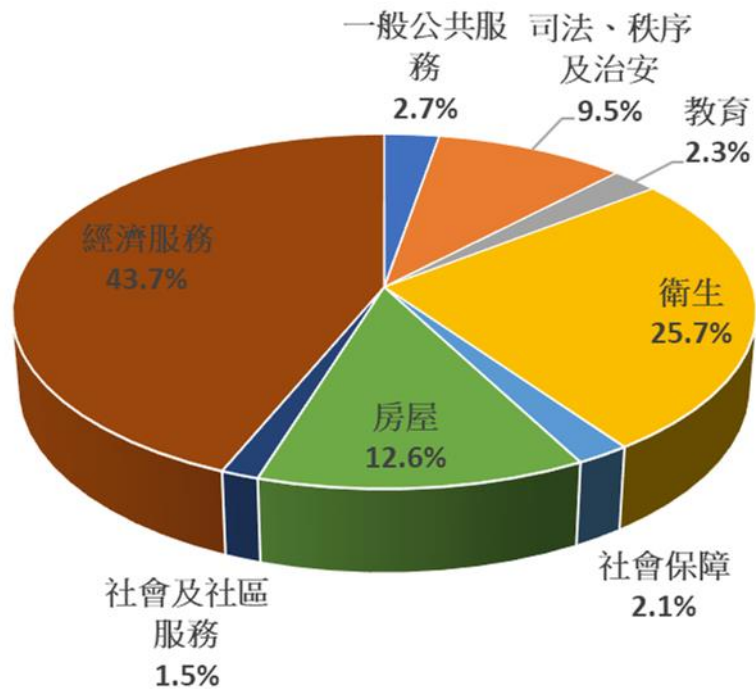

此頁留空

按項目群

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
公共設施工程	2,456,127,000.00	2,456,127,000.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,717,609,700.00	2,773,558,437.10
公共房屋	2,711,690,400.00	2,711,690,400.00
路橋、山坡及航道	2,480,312,200.00	2,856,705,950.72
填海造地項目群	69,396,200.00	69,396,200.00
澳門大學橫琴新校園項目群	263,149,100.00	263,149,100.00
部門設施工程	1,157,643,100.00	1,193,054,400.40
氹仔北安碼頭建造項目群	3,070,900.00	3,070,900.00
部門設備	502,638,900.00	637,638,900.00
交通樞紐項目群	7,298,700.00	7,298,700.00
港珠澳大橋珠澳口岸人工島項目群	215,000,000.00	215,000,000.00
公共設施設備	28,500,000.00	28,500,000.00
新監獄建造項目群	470,408,600.00	504,473,343.12
運輸工具	108,317,100.00	108,317,100.00
建造離島醫療綜合體項目群	4,203,406,700.00	4,203,406,700.00
儲水設施	43,361,700.00	43,361,700.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	45,000.00	45,000.00
智慧雲警務	56,825,000.00	56,825,000.00
新城填海區 A 區建造	826,194,200.00	826,194,200.00
總額	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34

按項目群

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,908,275,557.35	1,934,559,992.86	77.7	78.8
2,751,662,692.48	2,753,492,805.65	99.2	99.3
2,444,724,833.35	2,456,609,187.44	90.2	90.6
2,676,886,215.01	2,713,444,111.88	93.7	95.0
68,361,318.58	68,382,901.91	98.5	98.5
214,601,275.44	214,816,820.65	81.6	81.6
1,024,864,922.71	1,031,039,819.02	85.9	86.4
3,070,749.22	3,070,749.22	100.0	100.0
403,462,027.08	407,432,173.40	63.3	63.9
7,185,008.19	7,201,049.59	98.4	98.7
137,312,278.35	157,121,700.00	63.9	73.1
16,081,510.00	16,081,510.00	56.4	56.4
226,270,574.64	226,390,041.31	44.9	44.9
93,760,150.00	93,760,150.00	86.6	86.6
3,610,109,972.04	3,626,234,715.55	85.9	86.3
35,099,357.38	35,475,996.80	80.9	81.8
43,300.00	43,300.00	96.2	96.2
43,978,541.31	43,978,541.31	77.4	77.4
286,329,392.37	288,203,831.47	34.7	34.9
15,952,079,675.50	16,077,339,398.06	84.1	84.8

按組織分類

	二零二二年度 最初預算	二零二二年度 截至十二月三十一日 經核准後預算
	a	b
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	6,410,586,458.10
政府總部事務局	0.00	17,018,500.00
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00
財政局	512,875,600.00	528,521,199.00
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00
博彩監察協調局	269,140,000.00	234,967,400.00
旅遊局	4,006,000.00	4,006,000.00
勞工事務局	0.00	19,419,801.40
土地工務局	699,710,000.00	705,463,051.59
行政公職局	35,238,900.00	187,738,900.00
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00
警察總局	4,500,000.00	4,500,000.00
交通事務局	86,980,000.00	98,502,317.52
環境保護局	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00
人才發展委員會	6,307,600.00	6,307,600.00
文化局	172,704,800.00	172,704,800.00
體育局	27,065,800.00	27,065,800.00
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00
海事及水務局	53,470,000.00	53,470,000.00
懲教管理局	470,408,600.00	504,473,343.12
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	350,328,600.00
衛生局	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00
社會工作局	392,704,300.00	392,704,300.00
房屋局	1,919,300,000.00	1,877,014,660.61
澳門理工大學	138,167,200.00	138,167,200.00
澳門大學	263,149,100.00	263,149,100.00
澳門旅遊學院	16,150,000.00	16,150,000.00
審計署	38,400,000.00	38,400,000.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
5,823,720,638.11	5,890,547,688.55	90.8	91.9
10,211,983.42	10,211,983.42	60.0	60.0
104,822,155.92	109,756,987.96	71.6	75.0
498,644,416.77	501,637,549.13	94.3	94.9
41,285,675.50	41,285,675.50	76.5	76.5
48,651,531.44	48,651,531.44	20.7	20.7
0.00	0.00	0.0	0.0
19,419,801.40	19,419,801.40	100.0	100.0
545,350,375.34	549,768,529.20	77.3	77.9
179,663,801.00	179,663,801.00	95.7	95.7
4,754,400.00	4,754,400.00	79.2	79.2
28,986,782.00	28,986,782.00	84.3	84.3
1,910,159.00	1,910,159.00	42.4	42.4
95,544,107.00	96,416,614.52	97.0	97.9
696,626,468.16	697,093,667.65	68.7	68.7
2,836,970.67	2,916,757.20	45.0	46.2
102,850,168.60	117,069,090.01	59.6	67.8
9,051,155.20	9,051,402.70	33.4	33.4
447,255,937.19	447,544,025.99	93.5	93.5
44,893,289.28	45,216,070.80	84.0	84.6
226,270,574.64	226,390,041.31	44.9	44.9
321,176,568.44	321,823,599.59	91.7	91.9
4,236,622,574.14	4,246,489,247.19	86.7	86.9
223,235,887.30	225,009,457.90	56.8	57.3
1,771,823,949.85	1,779,587,357.55	94.4	94.8
66,357,450.63	68,693,051.83	48.0	49.7
214,601,275.44	214,816,820.65	81.6	81.6
0.00	0.00	0.0	0.0
13,380,720.41	13,380,720.42	34.8	34.8

按組織分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
檢察長辦公室	1,978,000.00	1,978,000.00
終審法院院長辦公室	16,278,500.00	16,278,500.00
廉政公署	7,242,500.00	7,242,500.00
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00
總額	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,792,400.00	1,806,980.00	90.6	91.4
15,185,720.00	15,272,165.00	93.3	93.8
2,810,000.00	4,310,000.00	38.8	59.5
152,342,738.65	157,857,439.15	58.5	60.6
15,952,079,675.50	16,077,339,398.06	84.1	84.8

按經濟分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
土地	312,791,300.00	271,776,883.96
房屋	2,942,383,800.00	2,955,267,278.64
樓宇及場所	7,535,972,500.00	7,639,449,668.29
路橋及航道	4,820,503,400.00	5,410,839,490.91
碼頭	11,170,200.00	11,170,200.00
陸路口岸	215,000,000.00	215,000,000.00
其他—不動產	44,106,700.00	46,288,210.84
運輸及交通工具	946,942,900.00	814,582,900.00
保安用品	123,655,000.00	123,655,000.00
醫療用品	383,907,200.00	371,797,891.00
住所用品	8,312,000.00	4,682,742.00
工場及餐廳用品	113,095,100.00	106,430,345.20
資訊及系統設備	331,406,000.00	333,584,600.00
其他—動產	135,686,300.00	139,817,872.00
軟件及版權	119,008,900.00	229,935,300.00
其他	277,053,200.00	283,534,648.50
總額	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
198,903,153.10	199,370,614.10	73.2	73.4
2,676,101,595.32	2,686,640,666.62	90.6	90.9
6,550,700,666.73	6,592,223,932.26	85.7	86.3
4,717,085,549.59	4,763,934,205.61	87.2	88.0
11,166,623.12	11,169,873.22	100.0	100.0
137,312,278.35	157,121,700.00	63.9	73.1
38,024,168.22	38,400,807.64	82.1	83.0
799,821,460.88	800,025,807.00	98.2	98.2
89,597,737.35	93,567,883.67	72.5	75.7
1,913,979.60	1,913,979.60	0.5	0.5
2,978,141.40	3,128,669.40	63.6	66.8
76,518,804.00	76,518,804.00	71.9	71.9
142,804,756.71	142,804,756.71	42.8	42.8
30,494,435.00	30,495,691.00	21.8	21.8
204,737,520.09	204,737,520.09	89.0	89.0
273,918,806.04	275,284,487.14	96.6	97.1
15,952,079,675.50	16,077,339,398.06	84.1	84.8

按功能分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	470,295,100.00	514,419,823.44
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	470,295,100.00	514,419,823.44
2-00 司法、秩序及治安	1,699,291,700.00	1,794,972,443.12
2-01 指揮部	2,700,000.00	2,674,772.10
2-02 警察及海關	864,587,500.00	926,203,500.00
2-03 消防	96,843,600.00	96,868,827.90
2-04 民防	4,500,000.00	4,500,000.00
2-05 司法及秩序	260,252,000.00	260,252,000.00
2-06 懲教	470,408,600.00	504,473,343.12
3-00 教育	417,466,300.00	436,886,101.40
3-02 教育	417,466,300.00	417,466,300.00
3-03 職業培訓	0.00	19,419,801.40
4-00 衛生	4,872,770,700.00	4,872,770,700.00
4-01 行政、規範及研究	22,500,000.00	22,500,000.00
4-02 醫療服務	4,850,270,700.00	4,850,270,700.00
5-00 社會保障	392,704,300.00	392,704,300.00
5-02 社會援助	392,704,300.00	392,704,300.00
6-00 房屋	2,379,940,100.00	2,379,940,100.00
6-01 行政、規範及研究	50,104,000.00	50,104,000.00
6-02 公共房屋	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
383,488,823.96	386,308,258.89	74.5	75.1
383,488,823.96	386,308,258.89	74.5	75.1
1,314,047,956.50	1,341,308,326.76	73.2	74.7
1,161,000.00	1,161,000.00	43.4	43.4
793,022,547.96	813,627,594.51	85.6	87.8
96,800,941.48	96,800,941.48	99.9	99.9
1,910,159.00	1,910,159.00	42.4	42.4
194,882,733.42	201,418,590.46	74.9	77.4
226,270,574.64	226,390,041.31	44.9	44.9
300,378,527.47	302,929,673.88	68.8	69.3
280,958,726.07	283,509,872.48	67.3	67.9
19,419,801.40	19,419,801.40	100.0	100.0
4,257,531,770.68	4,274,376,074.19	87.4	87.7
12,860,949.00	13,580,509.00	57.2	60.4
4,244,670,821.68	4,260,795,565.19	87.5	87.8
223,235,887.30	225,009,457.90	56.8	57.3
223,235,887.30	225,009,457.90	56.8	57.3
2,270,104,642.79	2,280,257,741.84	95.4	95.8
45,460,526.84	45,502,842.40	90.7	90.8
2,224,644,115.95	2,234,754,899.44	95.5	95.9

按功能分類

	二零二二年度 最初預算 a	二零二二年度 截至十二月三十一日 經核准後預算 b
7-00 社會及社區服務	301,083,600.00	275,422,975.56
7-01 文化	172,704,800.00	172,704,800.00
7-02 體育及康樂	110,578,800.00	86,378,800.00
7-04 氣象及地球物理	11,800,000.00	10,339,375.56
7-06 社會傳播	6,000,000.00	6,000,000.00
8-00 經濟服務	7,787,442,700.00	8,290,696,587.82
8-01 行政、規範及研究	269,140,000.00	234,967,400.00
8-04 基礎設施	896,484,900.00	876,932,142.39
8-05 運輸	5,131,896,700.00	5,602,653,697.02
8-08 旅遊	4,006,000.00	4,006,000.00
8-10 環保	1,052,869,100.00	999,440,400.00
8-11 商業及工業	135,833,000.00	135,833,000.00
8-12 科學技術	35,238,900.00	187,738,900.00
8-99 其他	261,974,100.00	249,125,048.41
總額	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二二年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二二年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
148,520,547.33	162,759,714.58	53.9	59.1
102,850,168.60	117,069,090.01	59.6	67.8
40,915,978.73	40,936,224.57	47.4	47.4
0.00	0.00	0.0	0.0
4,754,400.00	4,754,400.00	79.2	79.2
7,054,771,519.47	7,104,390,150.02	85.1	85.7
48,651,531.44	48,651,531.44	20.7	20.7
475,836,445.31	488,065,777.67	54.3	55.7
5,332,171,748.06	5,368,556,871.37	95.2	95.8
0.00	0.00	0.0	0.0
682,063,018.94	682,530,218.43	68.2	68.3
125,156,188.57	125,156,188.57	92.1	92.1
179,663,801.00	179,663,801.00	95.7	95.7
211,228,786.15	211,765,761.54	84.8	85.0
15,952,079,675.50	16,077,339,398.06	84.1	84.8



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件二

二零二二財政年度第四季度 「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, followed by several smaller initials and signatures.

二零二二財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門





建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	項目使用率為零的項目	預算
人才發展委員會	6,307,600.00	6,307,600.00	2,836,970.67	2,916,757.20	45.0%	46.2%	1	0	
土地工務局	699,710,000.00	705,463,051.59	545,350,375.34	549,768,529.20	77.3%	77.9%	27	2	
文化局	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	117,069,090.01	59.6%	67.8%	9	1	
司法警察局	146,363,000.00	146,363,000.00	104,822,155.92	109,756,987.96	71.6%	75.0%	7	1	
市政署	260,382,800.00	260,382,800.00	152,342,738.65	157,857,439.15	58.5%	60.6%	20	2	
交通事務局	86,980,000.00	98,502,317.52	95,544,107.00	96,416,614.52	97.0%	97.9%	2	0	
行政公職局	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	179,663,801.00	95.7%	95.7%	4	0	
身份證明局	54,000,000.00	54,000,000.00	41,285,675.50	41,285,675.50	76.5%	76.5%	2	0	
房屋局	1,919,300,000.00	1,877,014,660.61	1,771,823,949.85	1,779,587,357.55	94.4%	94.8%	15	1	
法務局	34,390,000.00	34,390,000.00	28,986,782.00	28,986,782.00	84.3%	84.3%	1	0	
社會工作局	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	225,009,457.90	56.8%	57.3%	2	0	
政府總部事務局	-	17,018,500.00	10,211,983.42	10,211,983.42	60.0%	60.0%	1	0	
旅遊局	4,006,000.00	4,006,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	
海事及水務局	53,470,000.00	53,470,000.00	44,893,289.28	45,216,070.80	84.0%	84.6%	5	0	
財政局	512,875,600.00	528,521,199.00	498,644,416.77	501,637,549.13	94.3%	94.9%	8	0	

林冠中

附件二

二零二二財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	項目使用率	預算為零的項目
終審法院院長辦公室	16,278,500.00	16,278,500.00	15,185,720.00	15,272,165.00	93.3%	93.8%	3	0	0
勞工事務局	-	19,419,801.40	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0%	100.0%	1	0	0
博彩監察協調局	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	48,651,531.44	20.7%	20.7%	1	0	0
廉政公署	7,242,500.00	7,242,500.00	2,810,000.00	4,310,000.00	38.8%	59.5%	2	0	0
新聞局	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	4,754,400.00	79.2%	79.2%	1	0	0
運輸工務司司長辦公室	5,589,450,000.00	6,410,586,458.10	5,823,720,638.11	5,890,547,688.55	90.8%	91.9%	39	0	0
審計署	38,400,000.00	38,400,000.00	13,380,720.41	13,380,720.42	34.8%	34.8%	1	0	0
衛生局	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	4,236,622,574.14	4,246,489,247.19	86.7%	86.9%	12	1	1
澳門大學	263,149,100.00	263,149,100.00	214,601,275.44	214,816,820.65	81.6%	81.6%	22	0	0
澳門保安部隊事務局	478,432,500.00	478,432,500.00	447,255,937.19	447,544,025.99	93.5%	93.5%	9	1	1
澳門旅遊學院	16,150,000.00	16,150,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	1
澳門特別行政區海關	288,712,600.00	350,328,600.00	321,176,568.44	321,823,599.59	91.7%	91.9%	6	0	0
澳門理工大學	138,167,200.00	138,167,200.00	66,357,450.63	68,693,051.83	48.0%	49.7%	2	0	0
檢察長辦公室	1,978,000.00	1,978,000.00	1,792,400.00	1,806,980.00	90.6%	91.4%	1	0	0
環境保護局	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	696,626,468.16	697,093,667.65	68.7%	68.7%	21	1	1

二零二二財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預行率	預算使用率	項目數量	項目使用率	預算為零的項目
懲教管理局	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	226,390,041.31	44.9%	44.9%	1	44.9%	0
警察總局	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	1,910,159.00	42.4%	42.4%	2	42.4%	1
體育局	27,065,800.00	27,065,800.00	9,051,155.20	9,051,402.70	33.4%	33.4%	3	33.4%	0
合計	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	16,077,339,398.06	84.1%	84.8%	230	84.8%	13

運輸工務司司長辦公室/海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

運輸工務司司長辦公室/土地工務局共同執行內港雨水蓄洪池及改善排水系統研究連探土服務

運輸工務司司長辦公室/環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

梁林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件三

二零二二財政年度第四季度 「投資計劃」預算使用率為0的項目

梁家輝

附件三

二零二二財政年度第四季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	土地工務局	嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道	29,781,000.00	29,781,000.00
2	土地工務局	地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程	11,800,000.00	10,339,375.56
3	文化局	澳門文學館	49,500.00	49,500.00
4	司法警察局	青茂口岸司法警察學校模擬射擊訓練系統設備	4,000,000.00	4,000,000.00
5	市政署	盧廉若馬路及周邊道路優化工程	13,300,000.00	13,300,000.00
6	市政署	筷子基北灣俾若翰街沿岸休憩區優化及涵箱渠建造工程	15,900,000.00	9,190,500.00
7	房屋局	偉龍馬路公共房屋第一期建造	4,072,000.00	1,132,513.00
8	旅遊局	高美士街旅遊活動中心重修及購置設備	4,006,000.00	4,006,000.00
9	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十八樓裝修工程	25,500,000.00	25,500,000.00
10	澳門保安部隊事務局	為治安警察局特警隊添置執行警務工作之車輛	14,188,900.00	14,188,900.00
11	澳門旅遊學院	旅遊學院氹仔新校區完善工程	16,150,000.00	16,150,000.00
12	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	108,059,400.00	108,059,400.00
13	警察總局	智慧民生	3,260,000.00	2,100,000.00
合計			250,066,800.00	237,797,188.56



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件四


二零二二財政年度執行期間 增加的「投資計劃」項目

寫
上
林
紀
承
輝


附件四

二零二二財政年度執行期間增加的「投資計劃」項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算
1	土地工務局	鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程	24,744,169.91
2	土地工務局	聖珊澤馬路A1及B1座官邸裝修連設計施工工程	1,460,624.44
3	土地工務局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	1,419,000.00
4	土地工務局	鄰近氹仔蓮花海濱大馬路新建道路工程	324,680.00
5	土地工務局	黑沙環三角花園行人天橋設施改善工程	13,746.08
6	市政署	南灣湖景大馬路行人道優化工程	500,000.00
7	行政公職局	雲計算中心擴容和網絡安全	135,000,000.00
8	行政公職局	擴展一戶通	17,500,000.00
9	房屋局	樂群樓中央燃氣系統改造工程	330,000.00
10	政府總部事務局	石排灣綜合社區大樓CN6B二樓裝修工程	17,018,500.00
11	財政局	《智慧財政》第二階段	18,849,600.00
12	勞工事務局	石排灣臨時訓練場建造項目	19,419,801.40



序號	建議部門	項目名稱	經核准預算
13	廉政公署	新口岸填海區Q-1D地段公共辦公大樓	4,040,000.00
14	運輸工務司司長辦公室	路環九澳高頂馬路擴闊工程	1,626,300.00
15	運輸工務司司長辦公室	新城填海區-D區	764,880.00
16	澳門大學	澳門大學- N23科研大樓G016課室設計及建造工程	3,873,106.50
17	澳門大學	澳門大學- CCBS腦認知與腦疾病綜合研究平台	2,842,700.00
18	澳門大學	澳門大學- CAI智能超算平台	1,703,545.20
19	澳門大學	澳門大學- S35教職員宿舍	1,516,987.20
20	環境保護局	氹仔污水處理廠氣浮式除油處理設施建造工程	8,558,898.00
21	環境保護局	內港南臨時污水處理設施建造工程	1,000,000.00
22	環境保護局	澳門污水處理廠升級工程II	547,840.00
23	環境保護局	氹仔島污水處理設施設備II	220,000.00



 黃紀林 啟
