



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共財政事務跟進委員會

第 5/VII/2023 號報告書

事由：跟進《二零二三財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》

一、 引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2021 年 11 月 19 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2021 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”
4. 委員會履行本身職責，於 2023 年 6 月 23 日召開會議以跟進《二零二三財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》。會

林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單(詳見附件二)。

5. 而截至2023年8月8日，政府尚未就上述提出的問題作回覆。
6. 為確保社會能適時知悉2023財政年度第一季度投資計劃預算的執行情況，委員會按照收到的資料分析，編製本份財政分析報告書。

二、 財政分析

7. 2023年的「投資計劃」最初預算為223.1億澳門元(以下簡稱為元)，截至第一季度的經核准預算為225.9億元，較最初預算增加2.8億元，實際開支為49.3億元，預算執行率為21.8%，預留金額為155.9億元，預算使用率為69%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件三。
8. 截至2023年第一季度「投資計劃」共有253個項目，當中22個是在第一季度期間新登錄的項目。在該22個新登錄的項目中，14個項目是在2022年或之前已立項的舊項目，而餘下的8個則是在2023年第一季度新設立的項目。該22個新登錄項目涉及的預算合共2.1億元。

黃
龍
學
上
單
承
以
陸
林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期
河底隧道修繕工程	29,874,086.73	舊項目	234,257,728.18	2018 2023
鄰近新危險品倉道 路優化工程	126,000.00	舊項目	32,944,062.59	2021 2022
港珠澳人工島燃料 中途倉連接道路設 計連建造工程	2,523,300.00	新項目	5,713,999.25	2023 2024
新城 A、B 區行車 天橋設計連建造工 程	21,721,000.00	新項目	3,420,939,000.00	2023 2027
路氹蓮花路公共道 路及排水網重整工 程	895,500.00	新項目	995,000.00	2023 2024

市政署

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成日期
林茂塘海邊大馬路兒 童遊樂場建造工程	20,000.00	舊項目	23,623,890.66	2020 2023
氹仔信安馬路及周邊 道路重鋪瀝青路面工 程	1,838,900.00	舊項目	31,954,426.00	2021 2023
關閘廣場、祐漢、馬 濟時總督大馬路及周 邊道路重鋪瀝青路面 工程	1,098,800.00	舊項目	15,027,932.25	2021 2023

黃
紅
學
L
吳
西
卜
程
林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
新口岸一帶行人道及 行車道優化工程	518,700.00	舊項目	6,891,357.16	2021 2023
海洋花園大馬路、青 洲河邊馬路及周邊道 路重鋪瀝青路面工程	1,016,200.00	舊項目	15,756,864.30	2021 2023
孫逸仙大馬路行車天 橋及周邊道路優化工 程	754,100.00	舊項目	9,000,650.00	2022 2023
亞馬喇前地及周邊道 路優化工程	5,000,000.00	新項目	28,645,900.00	2023 2024
澳門科學館圓形地及 周邊道路優化工程	5,000,000.00	新項目	8,976,000.00	2023 2024
澳門東亞運體育館下 水道整治工程	1,000,000.00	新項目	57,000,000.00	2023 2024
西灣湖廣場及周邊道 路優化工程	5,000,000.00	新項目	14,391,200.00	2023 2024

房屋局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
祐漢新村第八街公 共房屋建造工程	2,836,350.00	舊項目	493,668,008.00	2022 2027

林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

澳門大學

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
澳門大學-N23 科研大樓 G016 課室設計及建造工 程	3,873,106.50	舊項目	7,746,213.00	2019 2023
澳門大學-書院 W33 及 W34 加建層建造工程	150,528.00	舊項目	57,543,856.10	2019 2023
澳門大學- E11 FST 三樓 及 E12 FHS 地面層教學 實驗室建造工程	3,684,906.00	舊項目	7,369,812.00	2022 2023
澳門大學- IME 6G 太赫 茲通訊、100G 以太網背 板測試平臺及超低溫電 路	2,124,825.00	舊項目	16,903,160.00	2022 2023

澳門保安部隊事務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
橫琴口岸澳門口岸 區信息化建設(首階 段)	125,217,000.00	舊項目	125,217,000.00	2020 2023

環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
飛灰暫存倉建造工 程	250,000.00	新項目	63,190,000.00	2023 2026

黃
龍
學
九
軍
再
江
林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

9. 值得注意的是，在上述新登錄的項目中，由公共建設局負責的「新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程」項目的預算達 34.2 億元，執行期由 2023 年至 2027 年，該項目原執行期為 2023 年至 2030 年，惟在 2023 年第一季度將完成日期縮短 3 年至 2027 年。政府並未說明可提前完成的原因，而按照政府提供該項目的目的說明，項目是配合新填海區 A 區發展及島內居民出行需求，而預期項目能做到疏導新填海的 A 區南區的交通壓力的效益。
10. 此外，澳門保安部隊事務局負責的「橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)」項目的預算為 1.3 億元，並預計在 2023 年內完成有關項目，按照政府提供的說明，該項目的目的是提升橫琴口岸澳門口岸區的通關能力及效率，預期能為澳門居民及遊客提供更便捷的通關服務的效益。
11. 2023 年第一季度的經核准預算較 2022 年同期增加 42.3 億元，實際開支增加 2.7 億元，預留金額增加 20.8 億元，預算執行率下降 3.5%，預算使用率亦下降 4.6%，主要是由於 2023 年第一季度的經核准預算達 225.9 億元，高於 2022 年同期的 183.6 億元，致使所計得的預算執行率和預算使用率都出現下降。「投資計劃」的項目數量則較 2022 年第一季度的 221 個增加 32 個。

百萬澳門元

第一季	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2023 年	22,588	4,927	15,595	21.8%	69.0%	253
2022 年	18,356	4,654	13,513	25.4%	73.6%	221
變化	4,231	273	2,082	-3.5%	-4.6%	32

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

黃
龍
學
L.
學
林



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

12. 2023 年第一季度預算使用率為零的項目共有 89 個，涉及經核准預算約 15.9 億元(詳細資料可參閱附件四)：

部門	第一季
市政署	16
公共建設局	15
澳門大學	11
海事及水務局	9
衛生局	6
澳門保安部隊事務局	5
文化局	4
司法警察局	4
澳門特別行政區海關	4
環境保護局	4
身份證明局	2
警察總局	2
地球物理暨氣象局	1
行政公職局	1
社會工作局	1
旅遊局	1
財政局	1
澳門旅遊學院	1
體育局	1
合計	89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

13. 在 89 個預算使用率為零的項目中，市政署占 16 個，其次是公共建設局的 15 個，以及澳門大學的 11 個。
14. 此外，按照政府提供的預算執行情況說明，下述 7 個項目將不會在 2023 年繼續執行：

建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
公共建設局	新城區海底隧道工程	16,168,219.92	2017	2027
公共建設局	二龍喉公園環境資訊中心重建工程	17,523,000.00	2018	2023
公共建設局	氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程	11,745,000.00	2020	2023
公共建設局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00	2020	2023
海事及水務局	口岸人工島連接線—中水公共供水管道鋪設工程	25,913,300.00	2023	2023
文化局	澳門博物館改陳提升	8,220,000.00	2023	2025
環境保護局	永久飛灰堆填區之建造工程	179,960,494.80	2013	2023

15. 經分析 2023 年第一季度的項目資料，在全部的 253 個項目中，政府對 72 個項目的執行期作出修改，當中大部分為延遲項目的完成日期，亦有少部分是縮短完成日期，有關詳細資料可參閱附件五。



三、 意見和建議

16. 截至 2023 年第一季度，「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 21.8% 和 69%，整體進度尚算理想，委員會對此表示肯定。
17. 政府提交的「行政當局投資與發展開支計劃」2023 財政年度第一季度項目執行狀況是以新的財政系統編製，委員會注意到除資料的編排和文字的表述與舊版本有不同外，亦留意到在內容上亦有增減。
- 17.1 委員會認同增加“項目超出最初估算金額/延期原因”的說明，這有助了解項目的進度，以及遇到的困難或情況。委員會有部分委員認為亦應提供項目預算提早完成的原因說明，將更全面了解項目的執行情況。
- 17.2 委員會認為應保留“已獲行政長官批准的跨年度負擔”的資料，有助了解每年度預算須承擔的項目金額。
18. 待收到政府對 2023 財政年度第一季度的問題回覆後，委員會將在跟進 2023 財政年度第二季度預算執行報告時一併作出分析和討論。

黃江學
學
學
學
學
學
學
學



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

四、 總結

19. 委員會總結如下：

- (1) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- (2) 將本報告書送交特區政府。

二零二三年八月十一日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆桂

(秘書)

陳澤武



澳門特別行政區立法會
 Região Administrativa Especial de Macau
 Assembleia Legislativa

考
 93

邱庭彪
 邱庭彪

龐川
 龐川

林倫偉
 林倫偉

梁鴻細
 梁鴻細

張健中
 張健中

羅彩燕
 羅彩燕

李良汪
 李良汪



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件一

行政當局投資與發展開支計劃 二零二三財政年度第一季度 預算執行報告

黃
19E
學
七
軍
政
林

行政當局投資與發展開支計劃
二零二三財政年度第一季度
預算執行報告



此頁留空

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二三年第一季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

第一部份

二零二三年「投資計劃」的最初預算為澳門元 223 億 824 萬元，經核准後預算為澳門元 225 億 8,755 萬元，實際開支為澳門元 49 億 2,662 萬元，預算執行率為 21.8%¹，預留金額為澳門元 155 億 9,473 萬元，預算使用率為 69.0%²。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准後預算為澳門元 47 億 377 萬元。當中「長者公寓」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 10 億 9,381 萬元，預算執行率及使用率分別為 8.9% 及 64.7%。其次為「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」，經核准後預算為澳門元 5 億 5,070 萬元，預算執行率及使用率分別為 48.2% 及 98.7%。


按組織分類分，公共建設局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 81 億 586 萬元，佔整體預算的 35.9%，預算執行率及使用率分別為 25.9% 及 73.3%。其次為房屋局及衛生局，房屋局的經核准後預算為澳門元 32 億 6,873 萬元，佔整體預算的 14.5%，預算執行率及使用率分別為 43.3% 及 98.4%；衛生局的經核准後預算為澳門元 28 億 9,206 萬元，佔整體預算的 12.8%，預算執行率及使用率分別為 21.5% 及 38.9%。

按經濟分類分，「路橋及航道」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 64 億 8,426 萬元，佔整體預算的 28.7%，預算執行率及使用率分別為 25.5% 及 67.8%。當中主要包括「輕軌東線項目」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。其次為「樓宇及場所」，其經核准後預算為澳門元 62 億 4,505 萬元，佔整體預算的 27.6%，預算執行率及使用率分別為 20.6% 及 77.7%，主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「焚化中心第三期設施建造」等項目。

1 實際開支 / 經核准後預算


2 預留金額 / 經核准後預算

按經濟分類的經核准後預算分配

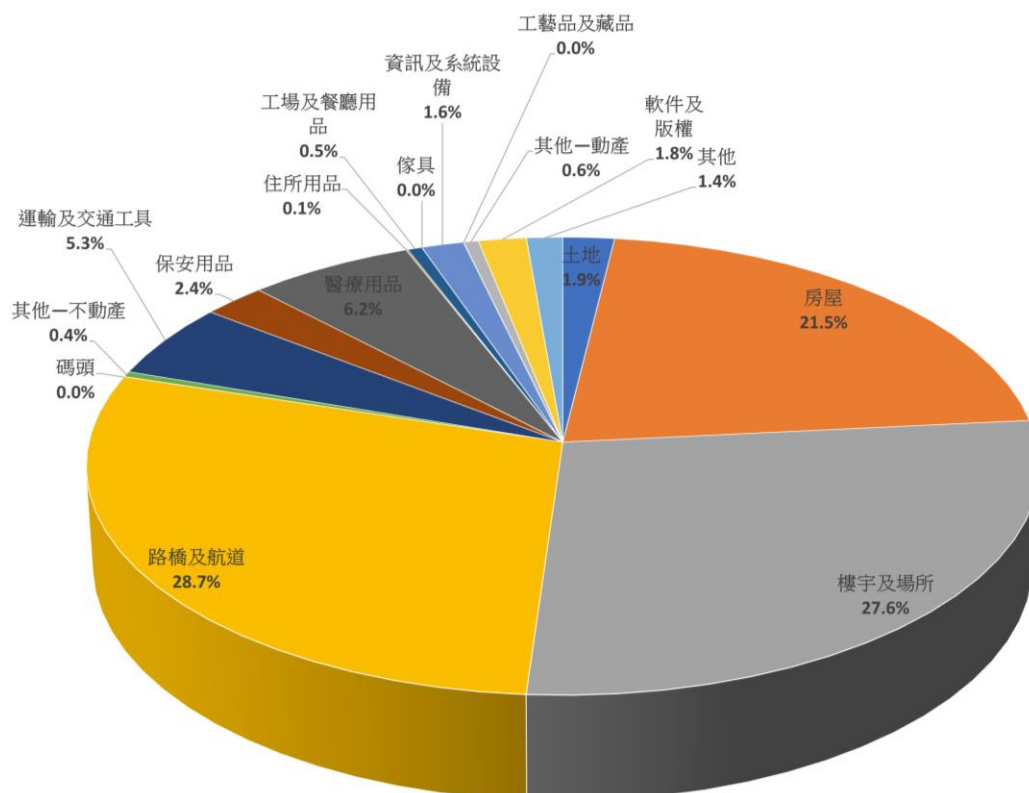

按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 105 億 3,359 萬元，佔整體預算的 46.6%，預算執行率及使用率分別為 20.1% 及 68.0%。當中主要包括「輕軌東線項目」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。其次為「房屋」，其經核准後預算為澳門元 37 億 2,751 萬元，佔整體預算的 16.5%，預算執行率及使用率分別為 44.0% 及 98.2%，當中主要包括「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」及「慕拉士大馬路公共房屋」等項目。

按功能分類的經核准後預算分配

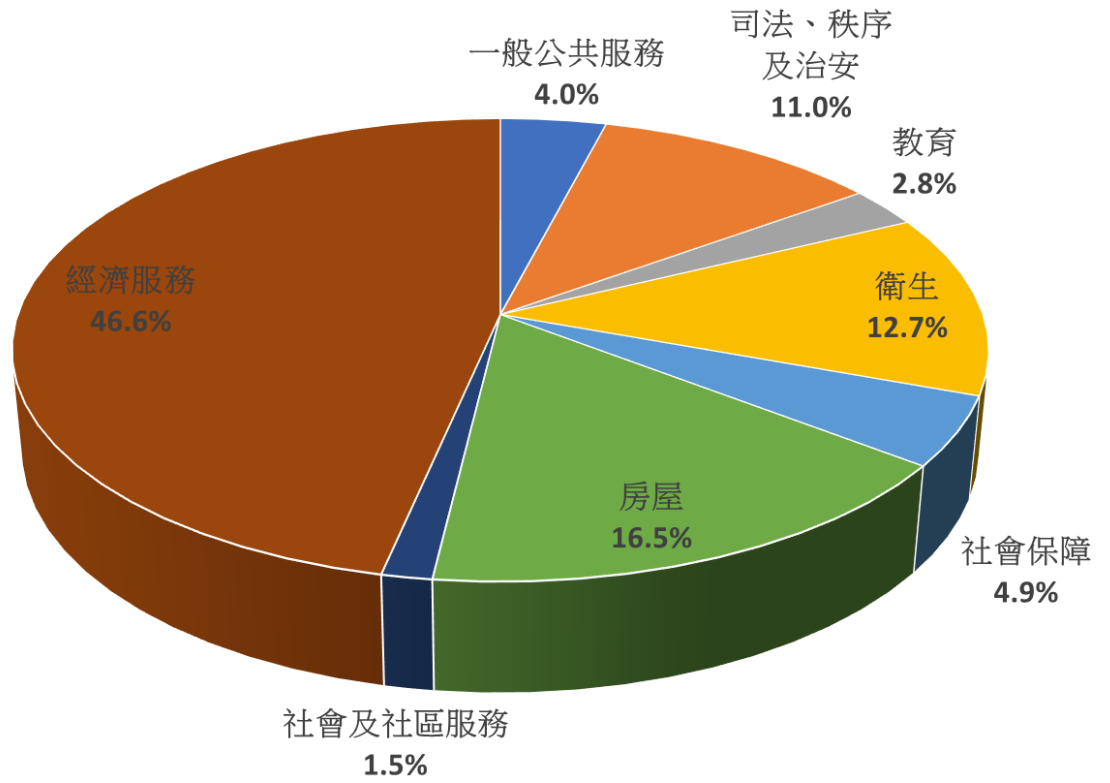

此頁留空

按項目群

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
公共設施工程	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
澳門城市集體運輸系統	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
公共房屋	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
路橋、山坡及航道	2,984,965,500.00	2,984,965,500.00
填海造地	33,462,800.00	33,462,800.00
澳門大學橫琴新校園	313,021,600.00	313,021,600.00
部門設施工程	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
部門設備	942,504,300.00	942,504,300.00
交通樞紐	925,000.00	925,000.00
公共設施設備	5,500,000.00	130,717,000.00
醫療設備	78,000,000.00	78,000,000.00
新監獄建造	473,258,800.00	569,576,406.54
運輸工具	137,323,000.00	137,323,000.00
建造離島醫療綜合體	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
儲水設施	60,985,900.00	60,985,900.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	582,600.00	582,600.00
智慧雲警務	314,381,700.00	314,381,700.00
新城填海區 A 區建造	744,268,400.00	744,268,400.00
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按項目群

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
315,158,473.10	1,861,942,720.65	11.3	66.7
955,442,223.66	2,657,028,370.01	22.7	63.0
1,705,767,280.71	4,250,930,499.63	36.3	90.4
818,918,671.88	2,250,476,366.66	27.4	75.4
33,423,387.52	33,462,761.62	99.9	100.0
6,321,786.80	170,292,034.80	2.0	54.4
287,413,293.92	1,597,662,943.65	14.7	81.7
15,422,400.00	479,376,550.51	1.6	50.9
924,902.00	924,902.00	100.0	100.0
74,166.00	3,315,666.00	0.1	2.5
0.00	0.00	0.0	0.0
96,484,314.65	466,170,021.37	16.9	81.8
19,252,075.50	125,511,075.50	14.0	91.4
611,082,688.48	1,033,801,657.27	23.4	39.6
8,669,638.83	58,731,601.20	14.2	96.3
0.00	0.00	0.0	0.0
346,686.00	71,560,285.69	0.1	22.8
51,919,937.18	533,547,308.08	7.0	71.7
4,926,621,926.23	15,594,734,764.64	21.8	69.0

按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
司法警察局	156,013,800.00	156,013,800.00
財政局	980,333,600.00	980,333,600.00
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00
行政公職局	265,250,000.00	265,250,000.00
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00
交通事務局	81,600,000.00	81,600,000.00
環境保護局	1,584,560,000.00	1,584,560,000.00
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	8,105,855,400.00	8,105,855,400.00
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	819,698,100.00
海事及水務局	303,400,000.00	303,400,000.00
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00
衛生局	2,892,058,200.00	2,892,058,200.00
社會工作局	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00
澳門旅遊學院	77,400,000.00	77,400,000.00
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
0.00	68,249,798.24	0.0	43.7
346,074,143.96	949,093,761.68	35.3	96.8
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	178,516,448.62	0.0	70.6
0.00	101,680,200.00	0.0	38.3
639,887.00	1,100,000.00	39.2	67.4
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	57,179,014.00	0.0	55.4
0.00	0.00	0.0	0.0
773,752.76	22,392,595.23	0.9	27.4
80,407,661.46	915,503,655.87	5.1	57.8
1,563,882.29	4,567,724.25	32.9	96.2
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
2,099,417,622.81	5,943,471,482.94	25.9	73.3
45,383,697.10	105,782,803.02	25.1	58.5
0.00	11,744,451.30	0.0	16.3
65,127,702.27	460,317,386.69	7.9	56.2
29,229,484.32	128,862,185.85	9.6	42.5
96,484,314.65	466,170,021.37	16.9	81.8
2,115,148.00	496,988,019.66	0.3	74.9
0.00	29,189,000.00	0.0	69.7
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
622,492,955.88	1,124,559,961.85	21.5	38.9
96,970,900.27	708,103,645.61	8.8	64.6
1,414,600,032.40	3,214,834,383.42	43.3	98.4
4,245,904.64	167,686,166.09	2.3	92.4
6,321,786.80	170,292,034.80	2.0	54.4
0.00	0.00	0.0	0.0
261,086.10	18,829,726.38	1.3	96.4

按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	129,464,600.00
廉政公署	19,620,000.00	19,620,000.00
市政署	239,634,000.00	297,406,083.00
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
4,422,281.60	14,558,602.00	30.4	100.0
7,117,403.92	128,227,226.20	5.5	99.0
170,000.00	4,980,000.00	0.9	25.4
1,474,278.00	96,520,668.28	0.5	32.5
4,926,621,926.23	15,594,734,764.64	21.8	69.0

按經濟分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
土地	541,177,700.00	436,048,052.47
房屋	4,867,378,900.00	4,861,919,463.90
樓宇及場所	6,018,341,300.00	6,245,052,895.44
路橋及航道	6,424,971,300.00	6,484,262,840.00
碼頭	4,184,100.00	4,184,100.00
其他—不動產	84,793,400.00	84,793,400.00
運輸及交通工具	1,220,810,100.00	1,188,876,940.00
保安用品	411,359,500.00	541,376,500.00
醫療用品	1,412,754,300.00	1,405,245,967.08
住所用品	18,159,800.00	15,499,529.55
工場及餐廳用品	107,146,000.00	122,804,397.50
傢具	812,000.00	812,000.00
資訊及系統設備	362,631,100.00	358,431,100.00
工藝品及藏品	1,500,000.00	1,500,000.00
其他—動產	125,827,600.00	125,496,998.00
軟件及版權	405,862,300.00	405,262,300.00
其他	300,534,000.00	305,983,605.60
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
64,919,078.13	129,420,704.89	14.9	29.7
1,705,825,280.71	4,345,068,516.13	35.1	89.4
1,288,595,689.43	4,855,347,955.50	20.6	77.7
1,653,254,538.84	4,394,939,273.97	25.5	67.8
265,715.99	4,183,860.95	6.4	100.0
8,669,638.83	58,731,601.20	10.2	69.3
139,389,743.50	942,998,109.11	11.7	79.3
346,686.00	164,998,493.58	0.1	30.5
0.00	9,325,855.00	0.0	0.7
998,326.80	3,295,643.20	6.4	21.3
5,265,460.00	52,079,505.60	4.3	42.4
0.00	0.00	0.0	0.0
74,166.00	189,377,915.91	0.0	52.8
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	4,550,086.00	0.0	3.6
15,422,400.00	197,226,814.00	3.8	48.7
43,595,202.00	243,190,429.60	14.2	79.5
4,926,621,926.23	15,594,734,764.64	21.8	69.0

按功能分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	858,237,000.00	914,739,083.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	858,237,000.00	914,739,083.00
2-00 司法、秩序及治安	2,263,808,700.00	2,485,343,306.54
2-01 指揮部	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 警察及海關	1,114,282,000.00	1,239,499,000.00
2-03 消防	115,931,700.00	115,931,700.00
2-04 民防	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 司法及秩序	467,336,200.00	467,336,200.00
2-06 懲教	473,258,800.00	569,576,406.54
3-00 教育	625,347,800.00	625,347,800.00
3-02 教育	625,347,800.00	625,347,800.00
4-00 衛生	2,875,340,600.00	2,875,340,600.00
4-01 行政、規範及研究	7,320,000.00	7,320,000.00
4-02 醫療服務	2,868,020,600.00	2,868,020,600.00
5-00 社會保障	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
5-02 社會援助	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
6-00 房屋	3,727,514,200.00	3,727,514,200.00
6-01 行政、規範及研究	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 公共房屋	3,609,962,200.00	3,609,962,200.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
214,254,901.47	766,019,703.51	23.4	83.7
214,254,901.47	766,019,703.51	23.4	83.7
175,221,343.44	1,641,036,174.99	7.1	66.0
0.00	0.00	0.0	0.0
67,027,343.27	802,212,513.18	5.4	64.7
0.00	99,459,000.00	0.0	85.8
0.00	0.00	0.0	0.0
11,709,685.52	273,194,640.44	2.5	58.5
96,484,314.65	466,170,021.37	16.9	81.8
10,567,691.44	367,167,200.89	1.7	58.7
10,567,691.44	367,167,200.89	1.7	58.7
626,099,087.28	1,140,486,618.25	21.8	39.7
0.00	0.00	0.0	0.0
626,099,087.28	1,140,486,618.25	21.8	39.8
96,970,900.27	708,103,645.61	8.8	64.6
96,970,900.27	708,103,645.61	8.8	64.6
1,639,749,979.60	3,659,220,159.42	44.0	98.2
30,953,599.16	116,393,305.40	26.3	99.0
1,608,796,380.44	3,542,826,854.02	44.6	98.1

按功能分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
7-00 社會及社區服務	334,053,200.00	329,323,200.00
7-01 文化	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 體育及康樂	129,929,700.00	125,199,700.00
7-04 氣象及地球物理	21,620,000.00	21,620,000.00
7-06 社會傳播	1,631,800.00	1,631,800.00
8-00 經濟服務	10,527,594,100.00	10,533,594,100.00
8-01 行政、規範及研究	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 基礎設施	1,026,972,700.00	1,010,004,943.00
8-05 運輸	6,983,949,000.00	7,006,916,757.00
8-08 旅遊	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 環保	1,579,122,300.00	1,579,122,300.00
8-12 科學技術	265,250,000.00	265,250,000.00
8-99 其他	415,034,200.00	415,034,200.00
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
46,023,584.10	148,612,627.66	14.0	45.1
45,383,697.10	105,782,803.02	25.1	58.5
0.00	41,729,824.64	0.0	33.3
0.00	0.00	0.0	0.0
639,887.00	1,100,000.00	39.2	67.4
2,117,734,438.63	7,164,088,634.31	20.1	68.0
0.00	178,516,448.62	0.0	70.6
113,655,819.87	679,734,909.82	11.3	67.3
1,745,690,331.31	4,881,795,997.53	24.9	69.7
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
80,407,661.46	910,216,035.87	5.1	57.6
0.00	101,680,200.00	0.0	38.3
177,980,625.99	408,139,241.18	42.9	98.3
4,926,621,926.23	15,594,734,764.64	21.8	69.0



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件二

《二零二三財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》的問題

黃
一
龍
梁
心
軍
承
承
心
陸
林

《二零二三財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》的問題

1. 按照政府於 2022 年第四季度的資料，「新城填海區-D 區」、「嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道」、「偉龍馬路公共房屋第一期建造」及「新口岸填海區 6B 地段政府辦公大樓」4 個項目均處於暫緩、解除合同或取消服務的狀態，但仍有較高的未支付判給金額，且在 2023 年第一季度亦沒有登錄預算。為此，請政府詳細說明 4 個項目的最新狀況、後續處理方法，以及倘需支付的金額。

2. 按照政府於 2022 年第四季度的資料，下述 10 個項目的預留款項未有被全數支付，而在 2023 年第一季度的預算中也沒有登錄預算。為此，請政府說明該 10 個項目未支付的預留款項是否無需支付，或在何時作出支付。
 - (1) 松山行人隧道和羅理基博士大馬路行人天橋系統
 - (2) 外港堤圍優化工程
 - (3) 澳門文化中心維修
 - (4) 台山中街公共房屋重建
 - (5) 澳門口岸管理區
 - (6) 北安大馬路週邊路網連接 E2 區天橋

黃
龍
景
L.
景
林

- (7) 澳門半島污水處理廠旁行人天橋加建升降機
- (8) 路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程
- (9) 皇朝廣場 A2 獨立單位裝修工程
- (10) 澳門理工學院氹仔新校區裝修工程

3. 按照 2022 年財政年度第四季度，政府對「澳門理工學院氹仔新校區裝修工程」項目的預算執行情況說明，項目擱置的其中一原因是無法集齊原澳門大學各大樓竣工圖則資料作編製工程計劃所致。為此，請政府詳細說明是否知悉，開展上述工程項目需集齊上述圖則，為何在作出判給圖則設計服務後，才發現無法集齊所有圖則，有否向原大樓的所有者澳門大學和工程部門土地工務局查詢有否該等圖則的存檔，以及擱置項目後仍需支付圖則設計費為多少。最後，將研發大樓 LG4 改建成停車場的計劃擱置後，研發大樓將作何用途。

4. 按照政府對「珠澳天氣雷達之升級設備」立項的必要性中的說明，珠澳天氣雷達是在《粵澳合作框架協議》下立項，該雷達由地球物理暨氣象局採購，是珠澳兩地氣象部門為加強對惡劣天氣監測而合作建設的天氣雷達。為此，請政府說明相關項目的升級設備及日後的維修費用，珠海市是否需要承擔部分的費用，倘需要，澳門特區及珠海市按甚麼準則承擔相關的費用。

林

5. 有關「新城填海區 C 區填土及堤堰」項目，按照政府提供的預算執行情況說明，該項目已於 2022 年 11 月完工。為此，請政府提供新城填海區 C 區將開展的項目計劃，以及相關的預算安排。
6. 按照政府提供的資料，截至 2023 年第一季度的經核准預算為 225.9 億元，較最初預算增加 2.8 億元。為此，請政府提供增加的 2.8 億元是涉及哪些項目，以及需透過備用撥款調撥預算的原因。
7. 按政府提供的項目最新預計執行期，「路環西側防洪排澇設施」、「鄰近氹仔蓮花海濱大馬路新建道路工程」、「益隆炮竹廠舊址局部活化工程」、「石排灣郊野公園發展規劃」及「林茂海邊大馬路雨水涵箱排水口臨時污水處理設施建造工程」的完成日期都較最初預計的延長 3 年。為此，請政府詳細說明相關項目延期完成的原因，以及項目的最新執行進度。
8. 按政府提供「永久飛灰堆填區之建造工程」項目的預算執行情況說明，“鑒於按照最新的規劃，將不會在建築廢料堆填區內建造永久飛灰堆填區，因此有關的建造工程公開招標已不作判給”，然而，在 2023 年第一季卻又新登錄「飛灰暫存倉建造工程」項目。該兩項目的立項必要性說明都表示，為臨時堆放由澳門垃圾焚化中心及澳門特殊和危險廢物處理站每日產出的固化飛灰包。為此，請政府詳細說明該兩項目的關聯性。

黃
龍
華
人
區
區
長
林

9. 委員會留意到政府送來的「行政當局投資與發展開支計劃」二零二三年財政年度第一季度項目執行狀況資料新增加「項目超出最初估算金額/延期的原因」的說明，當中大部分說明都解釋了超出最初估算/延期的原因，惟有小部分的解釋卻未能清晰說明有關原因，為此，委員會希望了解政府有否對上述說明訂立標準或內容規範。
10. 自 2023 財政年度，政府採用新的財務系統對「行政當局投資與發展開支計劃」作會計記帳，為確保資料的一致性，請政府說明新舊財務系統在會計處理上有否存在不同的記帳方式或標準。

黃紀梁
梁
梁
梁
梁
梁
梁



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件三

二零二三財政年度第一季度 「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

黃任學
L.
譚承
L.
程林

附件三

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	預算項目數量	項目使用率為零的項目
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00	1,563,882.29	4,567,724.25	32.9%	96.2%	1	0
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	0
公共建設局	8,105,855,400.00	8,105,855,400.00	2,099,417,622.81	5,943,471,482.94	25.9%	73.3%	49	15
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00	45,383,697.10	105,782,803.02	25.1%	58.5%	10	4
司法警察局	156,013,800.00	156,013,800.00	-	68,249,798.24	0.0%	43.7%	9	4
市政署	239,634,000.00	297,406,083.00	1,474,278.00	96,520,668.28	0.5%	32.5%	27	16
交通事務局	81,600,000.00	81,600,000.00	773,752.76	22,392,595.23	0.9%	27.4%	2	0
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
行政公職局	265,250,000.00	265,250,000.00	-	101,680,200.00	0.0%	38.3%	5	1
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00	1,414,600,032.40	3,214,834,383.42	43.3%	98.4%	20	0
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00	-	57,179,014.00	0.0%	55.4%	1	0
社會工作局	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00	96,970,900.27	708,103,645.61	8.8%	64.6%	2	1
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00	-	4,005,801.29	0.0%	89.3%	2	1
海事及水務局	303,400,000.00	303,400,000.00	29,229,484.32	128,862,185.85	9.6%	42.5%	16	9
財政局	980,333,600.00	980,333,600.00	346,074,143.96	949,093,761.68	35.3%	96.8%	6	1
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00	-	29,189,000.00	0.0%	69.7%	2	0
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	129,464,600.00	7,117,403.92	128,227,226.20	5.5%	99.0%	3	0

林文海

附件三

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00	-	178,516,448.62	0.0%	70.6%	1	0
廉政公署	19,620,000.00	19,620,000.00	170,000.00	4,980,000.00	0.9%	25.4%	1	0
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00	639,887.00	1,100,000.00	39.2%	67.4%	1	0
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00	261,086.10	18,829,726.38	1.3%	96.4%	1	0
衛生局	2,892,058,200.00	2,892,058,200.00	622,492,955.88	1,124,559,961.85	21.5%	38.9%	15	6
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00	6,321,786.80	170,292,034.80	2.0%	54.4%	25	11
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	819,698,100.00	65,127,702.27	460,317,386.69	7.9%	56.2%	14	5
澳門旅遊學院	77,400,000.00	77,400,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00	2,115,148.00	496,988,019.66	0.3%	74.9%	10	4
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00	4,245,904.64	167,686,166.09	2.3%	92.4%	1	0
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00	4,422,281.60	14,558,602.00	30.4%	100.0%	1	0
環境保護局	1,584,560,000.00	1,584,560,000.00	80,407,661.46	915,503,655.87	5.1%	57.8%	17	4
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54	96,484,314.65	466,170,021.37	16.9%	81.8%	1	0
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00	-	11,744,451.30	0.0%	16.3%	4	1
合計	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54	4,926,621,926.23	15,594,734,764.64	21.8%	69.0%	253	89

公共建設局及海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局及環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件四

二零二三財政年度第一季度 「投資計劃」預算使用率為0的項目

黃紀華
吳國昌
李卓人
林宇輝

附件四

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	公共建設局	澳門內港擋潮閘	2,000,000.00	2,000,000.00
2	公共建設局	粵澳新通道-聯檢綜合大樓	582,600.00	582,600.00
3	公共建設局	新城A區道路	2,428,000.00	2,428,000.00
4	公共建設局	新城區海底隧道工程	38,537,200.00	16,168,219.92
5	公共建設局	偉龍馬路公共房屋建造工程	8,160,000.00	8,160,000.00
6	公共建設局	二龍喉公園環境資訊中心重建工程	23,523,000.00	17,523,000.00
7	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	8,543,300.00	8,543,300.00
8	公共建設局	氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程	11,745,000.00	11,745,000.00
9	公共建設局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00	258,000.00
10	公共建設局	媽閣EP2污水泵站重建工程	32,240,000.00	32,240,000.00
11	公共建設局	地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程	17,120,000.00	17,120,000.00
12	公共建設局	新城A區堤堰優化工程	26,074,500.00	26,074,500.00
13	公共建設局	路環九澳高頂馬路擴闊工程	35,625,000.00	23,575,000.00
14	公共建設局	新城A、B區行車天橋設計建造工程	-	21,721,000.00
15	公共建設局	路氹蓮花路公共道路及排水網重整工程	-	895,500.00
16	文化局	益隆炮竹廠舊址局部活化工程	27,043,300.00	27,043,300.00

梁子傑

附件四

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
17	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	10,500,000.00	10,500,000.00
18	文化局	永福圍活化工程	10,800,000.00	5,326,900.00
19	文化局	澳門博物館改陳提升	8,220,000.00	8,220,000.00
20	司法警察局	司法警察局證專用品	8,530,000.00	8,530,000.00
21	司法警察局	司法警察局警政信息管理平台2.0	7,875,000.00	7,875,000.00
22	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備-2023	51,000,000.00	44,364,000.00
23	司法警察局	司法警察局購置及擴充情報系統設備	5,500,000.00	5,500,000.00
24	市政署	石排灣郊野公園發展規劃	5,750,000.00	1,795,300.00
25	市政署	北京街與高美士街周邊道路重鋪瀝青路面及優化部份渠道工程	4,867,000.00	6,932,300.00
26	市政署	氹仔信安馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	-	1,838,900.00
27	市政署	關閘廣場、祐漢、馬濟時總督大馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	-	1,098,800.00
28	市政署	路環九澳高頂馬路污水泵房渠改善工程	13,233,400.00	13,252,600.00
29	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	12,000,000.00	12,000,000.00
30	市政署	海洋花園大馬路、青洲河邊馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	-	1,016,200.00
31	市政署	盧廉若馬路及周邊道路優化工程	10,100,000.00	12,955,380.00
32	市政署	看台街及周邊道路優化工程	10,000,000.00	10,000,000.00

林炳光

附件四

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
33	市政署	友誼橋大馬路及周邊道路優化工程	20,000,000.00	20,000,000.00
34	市政署	竹灣馬路至黑沙海灘行人道優化工程	10,000,000.00	10,000,000.00
35	市政署	筷子基北灣新雨水及污水泵站EP9 e EER及周邊道路涵箱渠建造工程	30,200,000.00	2,782,420.00
36	市政署	亞馬喇前地及周邊道路優化工程	-	5,000,000.00
37	市政署	澳門科學館圓形地及周邊道路優化工程	-	5,000,000.00
38	市政署	澳門東亞運體育館下水道整治工程	-	1,000,000.00
39	市政署	西灣湖廣場及周邊道路優化工程	-	5,000,000.00
40	地球物理暨氣象局	珠澳天氣雷達之升級設備	4,500,000.00	4,500,000.00
41	行政公職局	構建政務通	60,000,000.00	60,000,000.00
42	身份證明局	購買智能卡式居民身份證製作系統升級服務	32,000,000.00	32,000,000.00
43	身份證明局	購買電子旅行證件製作系統硬件升級服務	12,500,000.00	12,500,000.00
44	社會工作局	新城A區A8地段社會設施大樓	2,537,300.00	2,537,300.00
45	旅遊局	利斯大廈重修工程	480,000.00	480,000.00
46	海事及水務局	海事及水務局—救援船隊	2,248,000.00	2,248,000.00
47	海事及水務局	海事及水務局船隊—汽船	663,900.00	663,900.00
48	海事及水務局	石排灣水庫擴容整治	400,000.00	400,000.00

林

附件四

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
49	海事及水務局	接駁至石排灣社區及澳門大學中水公共供水管道鋪設工程	31,190,000.00	31,190,000.00
50	海事及水務局	澳氹第四條跨海大橋起點周邊路網—公共供水管道鋪設工程	47,700,000.00	47,700,000.00
51	海事及水務局	口岸人工島連接線—中水公共供水管道鋪設工程	25,913,300.00	25,913,300.00
52	海事及水務局	黑沙環新填區P地段—公共供水管網鋪設工程	6,275,600.00	6,275,600.00
53	海事及水務局	路環臨時中水處理站建造工程	23,807,500.00	23,807,500.00
54	海事及水務局	新城A區共同管道—公共供水管道鋪設工程	14,626,000.00	14,626,000.00
55	財政局	《智慧財政》第一階段	19,236,000.00	19,236,000.00
56	衛生局	衛生局-改建及保養工程	6,199,500.00	4,399,500.00
57	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程	9,685,000.00	9,685,000.00
58	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十八樓裝修工程	25,500,000.00	25,500,000.00
59	衛生局	公共衛生專科大樓—設施設備	78,000,000.00	78,000,000.00
60	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	7,320,000.00	7,320,000.00
61	衛生局	石排灣SQ2地段專家住宅樓	53,737,600.00	53,737,600.00
62	澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務	176,000.00	176,000.00
63	澳門大學	澳門大學-研究生宿舍建造工程	7,703,900.00	7,703,900.00
64	澳門大學	澳門大學-S32教職員宿舍建造工程	19,748,500.00	12,173,282.50

林炳光

附件四

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
65	澳門大學	澳門大學 - N22科研大樓地面層及一樓ICIMS及FHS實驗室室建造工程	11,135,600.00	7,794,920.00
66	澳門大學	澳門大學 - N21科研大樓四樓量子訊息及6G實驗室室建造工程	9,272,500.00	5,784,500.00
67	澳門大學	澳門大學 - ICIMS動物實驗科研儀器設備	9,920,000.00	4,820,000.00
68	澳門大學	澳門大學 - IME硅光芯片信號鏈測試平台、硅光系統光電探針機台	9,150,000.00	7,025,175.00
69	澳門大學	澳門大學 - IAPME新型功能材料和器件之製備和測試設備	9,094,000.00	9,094,000.00
70	澳門大學	澳門大學 - FST區域生態環境研究	6,500,000.00	6,488,435.00
71	澳門大學	澳門大學 - FST沉浸式虛擬及混合現實交互技術分布式實驗平台	3,500,000.00	3,500,000.00
72	澳門大學	澳門大學 - FHS高通量人工智能成像分析平台	6,600,000.00	6,600,000.00
73	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00	7,572,700.00
74	澳門保安部隊事務局	智慧高校	11,559,000.00	11,559,000.00
75	澳門保安部隊事務局	橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)	-	125,217,000.00
76	澳門保安部隊事務局	青茂口岸澳門邊檢大樓七樓及八樓裝修工程	57,000,000.00	57,000,000.00
77	澳門保安部隊事務局	新增曲臂高噴車	8,900,000.00	8,900,000.00
78	澳門旅遊學院	澳門旅遊學院氹仔新校區完善工程	77,400,000.00	77,400,000.00
79	澳門特別行政區海關	海域智能監控系統二期建設工程	38,000,000.00	38,000,000.00
80	澳門特別行政區海關	新海關大樓弱電系統	20,650,000.00	20,650,000.00

林一

附件四

二零二三財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
81	澳門特別行政區海關	新海關大樓電子通訊及機房設施	16,800,000.00	16,800,000.00
82	澳門特別行政區海關	新海關大樓行動指揮中心設計及建造工程	24,500,000.00	24,500,000.00
83	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	72,000,000.00	72,000,000.00
84	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	37,220,600.00	37,220,600.00
85	環境保護局	離岸廢料堆填區建造工程	100,000,000.00	100,000,000.00
86	環境保護局	第二期飛灰堆填區建造工程	928,200.00	928,200.00
87	警察總局	智慧民防	16,000,000.00	16,000,000.00
88	警察總局	智慧民生	20,000,000.00	20,000,000.00
89	體育局	新城A區B4地段裙樓體育設施裝修工程	2,950,000.00	2,950,000.00
合計			1,521,256,000.00	1,586,642,632.42

林

黃



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

附件五

執行期變動的項目

黃
紀
梁
L.
梁
林
林

附件五

執行期變動的項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期	最新完成時間	完成時間變動
1	土地工務局	新城填海 B 區基礎建設	248,000.00	2018	2024	2025	1
2	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	8,543,300.00	2018	2022	2025	3
3	公共建設局	鄰近氹仔蓮花海濱大馬路新建道路工程	40,827,162.00	2018	2021	2024	3
4	公共建設局	鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程	700,000.00	2019	2022	2023	1
5	公共建設局	奧林匹克游泳館圓形地西南匝道橋建造工程	42,758,036.06	2021	2023	2024	1
6	公共建設局	輕軌東線項目	1,569,224,149.50	2021	2027	2028	1
7	公共建設局	東北大馬路空中走廊	50,457,000.00	2022	2025	2027	2
8	公共建設局	西灣大橋外圍翻新工程	60,820,000.00	2023	2023	2024	1
9	公共建設局	新城A、B區行車天橋設計連建造工程	21,721,000.00	2023	2030	2027	-3
10	文化局	益隆炮竹廠舊址局部活化工程	27,043,300.00	2022	2022	2025	3
11	文化局	荔枝碗船廠片區X11-X15活化工程	21,253,100.00	2022	2022	2023	1
12	市政署	石排灣郊野公園發展規劃	1,795,300.00	2019	2021	2024	3
13	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	2,628,000.00	2020	2024	2025	1
14	市政署	澳門半島南岸海濱綠廊工程	5,460,000.00	2020	2024	2025	1

林

附件五

執行期變動的項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期	完成時間	最新完成時間	變動
15	市政署	林茂塘海邊大馬路兒童遊樂場建造工程	20,000.00	2020	2022	2023	2023	1
16	市政署	北京街與高美士街周邊道路重鋪瀝青路面及優化部份渠道工程	6,932,300.00	2021	2022	2023	2023	1
17	市政署	氹仔信安馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	1,838,900.00	2021	2022	2023	2023	1
18	市政署	關閘廣場、祐漢、馬濟時總督大馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	1,098,800.00	2021	2022	2023	2023	1
19	市政署	路環九澳高頂馬路污水泵房渠改善工程	13,252,600.00	2021	2022	2023	2023	1
20	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	12,000,000.00	2021	2023	2024	2024	1
21	市政署	海洋花園大馬路、青洲河邊馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	1,016,200.00	2021	2022	2023	2023	1
22	市政署	黑沙青少年活動體驗營	7,965,000.00	2021	2024	2025	2025	1
23	市政署	盧廉若馬路及周邊道路優化工程	12,955,380.00	2022	2022	2023	2023	1
24	市政署	青茂口岸大樓市政署辦公室裝修工程	105,937,083.00	2022	2023	2024	2024	1
25	市政署	孫逸仙大馬路行車天橋及周邊道路優化工程	754,100.00	2022	2022	2023	2023	1
26	市政署	筷子基北灣俾若翰街沿岸休憩區優化及涵箱渠建造工程	23,679,600.00	2022	2023	2025	2025	2
27	市政署	看台街及周邊道路優化工程	10,000,000.00	2023	2023	2024	2024	1

林茂塘兒童遊樂場建造工程

附件五

執行期變動的項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期	最新完成時間	完成時間變動
28	市政署	友誼橋大馬路及周邊道路優化工程	20,000,000.00	2023	2023	2024	1
29	市政署	竹灣馬路至黑沙海灘行人道優化工程	10,000,000.00	2023	2023	2024	1
30	市政署	氹仔蓮花海濱大馬路污水管道整治工程	9,500,000.00	2023	2023	2024	1
31	交通事務局	友誼圓形地周邊路網重整	49,435,835.23	2018	2023	2025	2
32	房屋局	新城A區B5地段公共房屋建造工程	4,019,908.69	2019	2026	2028	2
33	房屋局	房屋局大樓重建工程	117,552,000.00	2020	2024	2026	2
34	房屋局	新城A區A6地段公共房屋建造工程	164,278,305.00	2022	2027	2026	-1
35	房屋局	新城A區A10地段公共房屋建造工程	106,037,400.00	2022	2027	2026	-1
36	房屋局	新城A區A11地段公共房屋建造工程	85,864,495.00	2022	2027	2026	-1
37	房屋局	樂群樓中央燃氣系統改造工程	14,881,800.00	2022	2025	2026	1
38	旅遊局	高美士街旅遊活動中心重修及購置設備	4,005,900.00	2014	2022	2023	1
39	旅遊局	利斯大廈重修工程	480,000.00	2016	2023	2024	1
40	海事及水務局	石排灣水庫擴容整治	400,000.00	2018	2025	2026	1
41	海事及水務局	海事及水務局船隊一玻璃鋼船	359,000.00	2021	2026	2027	1

林

附件五

執行期變動的項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期	完成時間	最新完成時間	變動
42	海事及水務局	接駁至石排灣社區及澳門大學中水公共供水管道鋪設工程	31,190,000.00	2023	2024	2023	2023	-1
43	海事及水務局	路環臨時中水處理站建造工程	23,807,500.00	2023	2024	2023	2023	-1
44	海事及水務局/公共建設局	九澳水庫擴容工程	60,585,900.00	2013	2023	2024	2024	1
45	財政局	氹仔北安O4地段倉庫大樓	135,568,200.00	2021	2023	2024	2024	1
46	終審法院院長辦公室	南灣湖C1至C3地段初級法院大樓建造工程	64,032,300.00	2021	2025	2026	2026	1
47	終審法院院長辦公室	南灣大馬路終審法院大樓建造工程	58,416,000.00	2021	2025	2026	2026	1
48	新聞局	新聞局永久檔案儲存倉	1,631,800.00	2021	2022	2023	2023	1
49	衛生局	離島醫療綜合體-研究、設計及顧問	8,290,129.32	2013	2025	2027	2027	2
50	衛生局	離島醫療綜合體-設施設備	1,432,685,970.68	2014	2025	2027	2027	2
51	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十八樓裝修工程	25,500,000.00	2022	2022	2023	2023	1
52	衛生局	石排灣SQ2地段專家住宅樓	53,737,600.00	2023	2026	2027	2027	1
53	澳門大學	澳門大學- N23科研大樓G016課室設計及建造工程	3,873,106.50	2019	2021	2023	2023	2
54	澳門大學	澳門大學-書院W33及W34加建層建造工程	150,528.00	2019	2022	2023	2023	1
55	澳門大學	澳門大學- E11 FST三樓及E12 FHS地面層教學實驗室建造工程	3,684,906.00	2022	2022	2023	2023	1

李煥堯

附件五

執行期變動的項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期	最新完成時間	完成時間變動
56	澳門大學	澳門大學- IAPME納米生物、元素微分析及光電器件加工設備	3,294,318.10	2022	2022	2023	1
57	澳門大學	澳門大學-IME 6G太赫茲通訊、100G以太網背板測試平臺及超低溫 電路	2,124,825.00	2022	2022	2023	1
58	澳門大學	澳門大學 - 研究生宿舍建造工程	7,703,900.00	2023	2027	2026	-1
59	澳門大學	澳門大學 - FHS高通量人工智能成像分析平台	6,600,000.00	2023	2023	2024	1
60	澳門保安部隊事務局	購買消防救援車輛一批以取替部份車輛(第二期)	78,120,000.00	2018	2024	2026	2
61	澳門保安部隊事務局	橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)	125,217,000.00	2020	2022	2023	1
62	澳門特別行政區海關	新海關大樓建造	296,972,000.00	2017	2024	2023	-1
63	澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關-兩條棧橋建造 2	43,198,400.00	2018	2023	2024	1
64	澳門特別行政區海關	港珠澳大橋澳門跨境貨物轉運站	79,385,000.00	2021	2024	2023	-1
65	環境保護局	永久飛灰堆填區之建造工程	179,960,494.80	2013	2030	2023	-7
66	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	72,000,000.00	2015	2027	2028	1
67	環境保護局	建築廢料管理制度之配套設施	5,500,000.00	2017	2023	2024	1
68	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	37,220,600.00	2018	2036	2030	-6

黃

附件五

執行期變動的項目

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期	最新完成時間	完成時間變動
69	環境保護局	廚餘集中處理設施	247,988,042.33	2018	2026	2027	1
70	環境保護局	林茂海邊大馬路雨水涵箱排水口臨時污水處理設施建造工程	69,000,000.00	2021	2023	2026	3
71	環境保護局	澳門跨境工業區污水處理站太陽能光伏系統工程	25,500,000.00	2023	2023	2024	1
72	體育局	運動員培訓及集訓中心輔助大樓	57,002,437.00	2017	2027	2028	1

青
 1
 紀
 學
 上
 梁
 國
 英
 林
