



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共財政事務跟進委員會

第 2/VII/2025 號報告書

事由：跟進《二零二四財政年度第三季度投資計劃預算執行報告》

一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2021 年 11 月 19 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2021 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”
4. 委員會履行本身職責，於 2025 年 1 月 22 日召開會議以跟進《二零二四財政年度第三季度投資計劃預算執行報告》。會後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

5. 政府於 2025 年 4 月 11 日就委員會所提出的問題提供了回覆。
6. 委員會經分析政府提供的回覆後，一致認為政府提供的回覆資料內容詳細，為此，委員會決定不再邀請政府代表列席會議就相關事宜向委員會作介紹與溝通。
7. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。
8. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

二、跟進情況

9. 就委員會向政府提出的問題和政府的回覆，僅扼要轉述有關內容。
10. 按照政府提供的資料顯示，「橫琴口岸澳門口岸區二層臨時交通樞紐平台改造工程」項目於 2024 年第二季度設立，當時的經核准預算為 8,444 萬元，而項目第三季度的經核准預算則增加至 2.2 億元，為此，要求政府說明項目的具體內容、最新進度和計劃，以及預算變動的詳細原因。
11. 政府回覆：

項目的具體內容

為使橫琴口岸澳門口岸區具備完整交通功能的交通樞紐平台，便利市民及旅客使用橫琴口岸之通關設施，須將當時橫琴口岸的二層南側交通樞紐平台進行改造，才能與已開通的北側平台組成一個具備完整功能的交通樞紐平台。



最新進度和計劃

有關工程已於 2024 年 11 月 5 日完成臨時接收，除工料測量服務最後一期 68,000 元，預計於 2025 年支付外，其餘工程及相關費用已支付。

預算變動的原因

「橫琴口岸澳門口岸區二層臨時交通樞紐平台改造工程」立項時原按指示由澳門保安部隊事務局執行，並預計於 2025 年完工，項目總金額約為 240,476,000 元，2024 年度及 2025 年度的撥款承擔分別為 84,436,600 元及 156,039,400 元。

其後該項目改由公共建設局執行，而開支仍由澳門保安部隊事務局承擔。及後收到公共建設局公函通知，因該項目屬緊急項目，要求於 2024 年 10 月完成，故工程費用須於 2024 年支付，並預計該項目總金額約為 223,480,000 元，分別由 2024 年度 223,412,000 元及 2025 年度 68,000 元撥款承擔，且要求進行追加預算 139,000,000 元。

因屬緊急項目並須提前於 2024 年完成，為配合公共建設局及相關項目進度，須備有足夠撥款承擔，故引致第三季度之撥款較第二季度立項時的撥款增加 139,000,000 元，經核准預算撥款增加至 223,436,600 元 (84,436,600 元 + 139,000,000 元)。

12. 關於「新城區海底隧道工程」項目，2024 年第三季度的預算執行情況說明為“解除合同及相關賠償已獲批准，並完成支付賠償”。然而，2024 年第二季度預計項目的完成日期為 2024 年，



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

2024年第三季度則將項目預計完成日期推遲到2027年。為此，要求政府說明項目的具體進度和預計完成日期推遲的原因。

13. 政府回覆：

第二季執行報告內容已說明“項目已終止”，而該項目最後一項服務於2024年6月20日由運輸工務司司長批准解除合同，預算執行情況說明“解除合同及相關賠償已獲批准，正在跟進後續，將於第三季完成支付。”

後續於2024年7月份完成支付程序，第三季執行報告預算執行情況說明，“解除合同及相關賠償已獲批准，並完成支付賠償。”

因而終止「新城區海底隧道工程」項目的行政程序於第二季完成，並於第三季完成支付程序，該項目於2024年畫下句號。而第三季執行報告之項目最新預計執行期至2027，應屬筆誤。

14. 經比較政府提供的2024年第二季度與2024年第三季度的資料，顯示下述項目預計的完成日期有所提前。為此，要求政府就項目預計完成日期提前的原因提供詳細說明：

建議部門	項目名稱	2024年第二季度	2024年第三季度
		預計完成日期	預計完成日期
行政公職局	電子政務展廳展品	2025年	2024年
公共建設局	輕軌東線項目	2031年	2027年



15. 政府回覆：

「電子政務展廳展品」

就行政公職局的 PIDDA 項目「電子政務展廳展品」，2024 年第二季度預算執行情況報告內填報預計完成日期為 2025 年，2024 年第三季度預算執行情況報告內填報預計完成日期為 2024 年。

經查閱相關資料，2024 年第三季度預算執行情況報告的預計完成日期實屬筆誤情況，應為 2025 年。

於 2023 年編製 PIDDA 預算項目「電子政務展廳展品」，原預計執行期為 2024 年 12 月。由於 2024 年 6 月行政公職局獲悉位於慕拉士馬路的公共房屋項目交收時間預期後，預計至 2025 年才完成交付，相關展品採購亦須順延。因此，於 2024 年第二季度的 PIDDA 預算執行報告中，PIDDA 項目“電子政務展廳展品”的預計完成日期調整為 2025 年 12 月及解釋說明延期原因。於 2024 年 6 月編製 2025 年 PIDDA 預算時，將該項目的執行年期由 2024 年 12 月延至 2025 年 12 月，2025 年預算為 12,000,000 元。

然而，於提交 2024 年第三季度執行報告時，漏了填寫有關項目延期原因和延至 2025 年 12 月的說明，以致第三季度 PIDDA 執行報告內沒有陳述相關內容，與第二季度 PIDDA 預算執行報告存在差異。

對此，行政公職局已於 2024 年第四季度預算執行情況報告修正有關錯誤資料，同時，為了避免有關錯誤再次的發生，行政公職局將認真審視季度報告資訊準確性和更新實時性。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

「輕軌東線項目」

有關「輕軌東線項目」於 2024 年第三季度報告中，項目預計完成日期顯示為 2027 年。經確認，「輕軌東線項目」於立項時的預計執行期至 2027 年，當填寫 2024 年第三季度 PIDDA 預算執行報告時，因未有於智慧財政系統中增加 2028 年至 2031 年各年的預算金額，故出現 2024 年度第三季度的預計執行期（預計完成日期）與第二季度的資料不一致的情況。由於「輕軌東線項目」（土建及行車系統）的預計完成日期為 2029 年，且合同中附有兩年保固期，因此東線項目的預計執行年期須到 2031 年。

於第四季執行報告已更正項目執行期至 2031 年。

16. 「大潭山隧道」項目預算由 2024 年第二季度的 9,735 萬元，增加 20.1 億元，至 2024 年第三季度的 21.5 億元。為此，要求政府就項目預算增加的原因，以及項目的最新進度和計劃提供詳細說明。

17. 政府回覆：

經查核後，2024 年第二季所填寫的估算金額 9,735 萬元為已判給服務的金額，填寫 2024 年第二季度報告時未有包含其他未作招標/判給的工程及服務的預算，此情況已於填寫 2024 年第三季報告時作出調整，故出現預算增加情況。

「大潭山隧道」項目分為兩個標段進行招標及施工，其中一標段為「大潭山隧道及其連接線設計連建造工程 — 隧道及南連



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

接線」，另一標段為「大潭山隧道及其連接線設計連建造工程—北連接線」，兩個標段均已完成招標程序，預計於2025年第二季至第三季期間陸續開展施工。

18. 「路環西側防洪排澇設施」項目預算由2024年第二季度的4.4億元，增加2.7億元，至2024年第三季度的7億元。為此，要求政府就項目預算增加的原因，以及項目的最新進度和計劃提供詳細說明。

19. 政府回覆：

「路環西側防洪排澇工程」分為兩階段施工，2024年第三季度預算的增加原因為第二季度的預算只為第一階段涉水項目，且未有考慮項目第一階段施工期間的臨時工作，包括臨時航道的清淤、兩個臨時施工平台、臨時碼頭、海上施工船舶的租賃等。另外，亦未有包括其他質量監控服務、環境監控服務和監察服務的費用。

項目的第一階段工程已於2024年12月進行判給，現正進行相關準備工作，包括項目的宣導、相關部門的施工准照申請、環境監測的基線測量、國內相關部門的准照申請、編製施工計劃等，待簽署工程合約後正式展開，合約施工期為710工作天。

20. 下述5個項目在2024年第三季度的最新預算較2024年第二季度減少金額均超過1億元。為此，要求政府就項目預算減少的原因，以及項目的最新進度和計劃提供詳細說明。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

百萬澳門元

建議部門	項目名稱	第三季度項目 最新估算金額	第二季度項目 最新估算金額	變動
房屋局	新城 A 區 B5 地段公共房屋建造工程	1,381	1,654	-273
房屋局	新城 A 區 B11 地段公共房屋建造工程	1,019	1,492	-473
房屋局	新城 A 區 B12 地段公共房屋建造工程	1,023	1,630	-607
房屋局	新城 A 區 B7 地段公共房屋建造工程	1,830	2,879	-1,049
房屋局	新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程	2,037	3,324	-1,286

21. 政府回覆：

有關 5 個項目 2024 年第三季度的最新預算較 2024 年第二季度減少的說明如下：

- 因 5 個項目於 2024 年第二季度項目預算仍沿用 2024 年以前的概算金額，但於 2024 年 6 月編製 2025 年度項目預算金額時，以 5 個項目的預計開支金額進行更新，而 5 個項目 2024 年以前的概算金額較預計開支金額大，因此出現 5 個項目 2024 年第三季度的最新預算較 2024 年第二季度減少。
- B5 地段公共房屋現正進行地庫開挖及支撐工作，總進度已完成約百分之八；B7 地段公共房屋現正進行地庫開挖及支



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

撐工作，總進度已完成約百分之八；B8 地段公共房屋現正進行地庫開挖及支撐工作，總進度已完成約百分之十三；B11 地段公共房屋現正進行地庫開挖及支撐工作，總進度已完成約百分之十五；B12 地段公共房屋現正進行地庫樓板建造工作，總進度已完成約百分之十。5 個項目現正按預期進度施工，預計分別於 2027 年及 2028 年完成。

- 於第四季度的執行報告已重新更新估算金額。
- 5 個地段詳細資料如下：

項目名稱	樓層	用途	數量
新城 A 區 B5 地段公 共房屋建 造工程	地庫三	停車場	提供車位總數量為 699 個，汽車車位 348 個及電單車車位 351 個。
	地庫二	停車場	
	地庫一	商業及交通	
	地面	商業	
	一層	商業	
	二層	商業	
	三層	平台	
	四層至二十 八層	第 1 至 2 座 27 層住 宅,第 3 座 28 層住 宅	提供 1003 個住宅單位



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

黃任林 梁 七 梁海山 梁

項目名稱	樓層	用途	數量
新城 A 區 B7 地段公 共房屋建 造工程	地庫三	停車場	提供車位總數量為 944 個，汽車車位 472 個及電單車車位 472 個。
	地庫二	停車場	
	地庫一	停車場及地下街	
	地面	商業	
	一層	商業	
	二層	商業及社設	
	三層	平台	
新城 A 區 B8 地段公 共房屋建 造工程	四層至二十 八層	住宅	提供 1344 個住宅單位
	地庫三	停車場	提供車位總數量為 1120 個，汽車車位 560 個及電單車車位 560 個。
	地庫二	停車場	
	地庫一	停車場及地下街	
	地面	商業	
	一層	商業	
	二層	商業及社設	
	三層	平台	
	四層至二十 七層	住宅	提供 1495 個住宅單位



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

項目名稱	樓層	用途	數量
新城 A 區 B11 地段 公共房屋 建造工程	地庫三	公眾停車場、設備 配套用房	提供車位總數量為 527 個，汽車車位 272 個及電單車車位 255 個。
	地庫二	公眾停車場、設備 配套用房、地下街	
	地庫一	公眾停車場、設備 配套用房、地下街	
	地面	商業，樓宇其它用 途（公眾停車場、 住宅、商業、社 設）的出入口大 堂、疏散樓梯	
	一層	商業、設備配套用 房	
	二層	商業及社設、設備 配套用房	
	三層	平台花園、水缸及 泵房	
	四層至二十 七層	住宅、設備配套用 房	提供 768 個住宅單位



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

項目名稱	樓層	用途	數量
新城 A 區 B12 地段 公共房屋 建造工程	地庫二	停車場	提供車位總數量為 524 個，汽車車位 262 個及電單車車位 262 個。
	地庫一	停車場	
	地面	商業空間及社會設 施、公共廁所、垃 圾壓縮桶房、住宅	
	一層	商業空間及社會設 施	
	二層	商業空間及社會設 施	
	三層	群樓天面平台花 園，商業及社會設 施休憩空間	
	四層至二十 七層	住宅	提供 805 個住宅單位

三、財政分析

22. 2024 年的「投資計劃」最初預算為 174.2 億元，截至第三季度的經核准預算為 181.8 億元，較最初預算增加 7.6 億元，實際開支為 128.2 億元，預算執行率為 70.5%，預留金額為 169.8 億元，預算使用率為 93.4%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

23. 2024 年第三季度「投資計劃」與 2024 年第二季度「投資計劃」比較，經核准預算增加 1.3 億元，實際開支增加 42.9 億元，預留金額增加 16.9 億元，預算執行率上升 23.3%，預算使用率則上升 8.7%。

百萬澳門元						
2024 年	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
第三季	18,175	12,815	16,977	70.5%	93.4%	241
第二季	18,041	8,520	15,286	47.2%	84.7%	233
變化	134	4,295	1,691	23.3%	8.7%	8

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

24. 按部門分析，2024 年第三季度的經核准預算金額發生變動的部門為如下 13 個：

百萬澳門元			
建議部門	2024 年第三季度 經核准預算	2024 年第二季度 經核准預算	變動
澳門保安部隊事務局	632	497	134
公共建設局	5,282	5,196	86
環境保護局	917	850	67
博彩監察協調局	192	168	24
法務局	110	105	5
交通事務局(註 1)	77	76	0
房屋局(註 2)	5,526	5,526	-0
身份證明局	28	29	-1



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

建議部門	2024 年第三季度 經核准預算	2024 年第二季度 經核准預算	變動
勞工事務局	19	22	-3
行政公職局	291	304	-13
財政局	604	628	-24
市政署	626	673	-47
海事及水務局	198	292	-94
合計	14,500	14,366	134

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

註 1:交通事務局經核准預算的變動金額為 340,116.90 元。

註 2:房屋局經核准預算的變動金額為-462,784.69 元。

25. 在上述 13 個經核准預算金額發生變動的部門中，澳門保安部隊事務局增加的經核准預算最高，金額為 1.3 億元，按政府提供的資料顯示，該局在 2024 年第二季度新設立的「橫琴口岸澳門口岸區二層臨時交通樞紐平台改造工程」項目的經核准預算為 8,444 萬元，而第三季度的經核准預算則增加至 2.2 億元。政府已應委員會的要求，提供了有關預算變動的原因，有關說明可參閱本報告書第 11 點。
26. 此外，截至 2024 年第三季度，有關「橫琴口岸澳門口岸區二層臨時交通樞紐平台改造工程」項目已判給金額為 2.2 億元，已支付金額為 1.5 億元，而預計在第四季度需支付的金額為 7,074 萬元。
27. 截至 2024 年第三季度「投資計劃」共有 241 個項目，當中 9 個是在第三季度新登錄的項目，被取消的項目則有 1 個。在該 9 個



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

新登錄的項目中，有 3 個項目是在 2024 年之前已立項的舊項目，而餘下的 6 個則是在 2024 年第三季度新設立的項目。該 9 個新登錄項目涉及的經核准預算，金額合共為 1,851 萬元。

公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目 概算/預算	開始/完成 日期	
西灣湖景大馬路行人 天橋	480,000.00	新項目	30,300,000.00	2024	2027
輕軌延伸青茂口岸	446,800.00	新項目	3,040,000,000.00	2024	2029
氹仔警司處警務大樓 (BT29B1及B T299B)	122,667.79	舊項目	12,012,989.89	2016	2024

民航局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目 概算/預算	開始/完成 日期	
氹仔客運碼頭直升機 場	8,050,000.00	新項目	21,380,000.00	2024	2025

交通事務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目 概算/預算	開始/完成 日期	
路氹城駕駛學習暨考 試中心	340,116.90	舊項目	69,154,941.08	2011	2024



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

海事及水務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目 概算/預算	開始/完成 日期
新城 A 區西側道路— 自來水公共供水管道 鋪設工程	2,515,040.00	舊項目	20,482,896.00	2022 2024

衛生局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目 概算/預算	開始/完成 日期
新城 A 區衛生站裝修 工程	3,955,901.15	新項目	13,290,000.00	2024 2025

環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目 概算/預算	開始/完成 日期
澳門國家野外站及氣 象聯合觀測平台設計 連建造工程	2,000,000.00	新項目	7,600,000.00	2024 2025
氹仔北安港廣場太陽 能光伏系統設計及建 造工程	600,000.00	新項目	8,900,000.00	2024 2025

28. 另外，於 2024 年第三季度被取消的項目為財政局的「《智慧財政》第一階段」，按照政府提供的說明，項目的預算執行情況為：



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

“《智慧財政》第一階段由不同的模組所組成，於 2021 年 12 月份正式啟動並預計於 3 年內完成，2022 年完成構建的預算模組及中央採購模組，已經推行至所有公共部門使用。

財政局一直緊密跟進項目工作進度，新的系統開發商已於第三季初順利接手並延續《智慧財政》系統的研發工作。按照財政局與新的開發商所訂定的工作時間表，2024 年會完成系統的所有研發工作、並將於 2025 年完成系統的構建工作，而財政局無需於研發階段支付任何費用，因此 2024 年將不須承擔任何開支。”

29. 2024 年第三季度的經核准預算較 2023 年同期減少 48.6 億元，實際開支減少 10.7 億元，預留金額減少 26.6 億元，預算執行率上升 10.2%，預算使用率亦上升 8.1%。2024 年第三季度「投資計劃」的項目數量為 241 個，較 2023 年同期的 274 個，減少 33 個。

百萬澳門元

第三季	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2024 年	18,175	12,815	16,977	70.5%	93.4%	241
2023 年	23,031	13,883	19,639	60.3%	85.3%	274
變化	-4,856	-1,068	-2,662	10.2%	8.1%	-33

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

30. 另外，按照政府提供的資料，預計下表序號 1 和序號 2 項目將不會在 2024 年繼續執行，而根據政府自 2024 年第一季度提供的資料，在第一季度時亦預計序號 3 及序號 4 的項目也不會在 2024 年繼續執行。

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
1	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	4,997,783.00	2023 年	2025 年
2	民航局	機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	55,118,000.00	2023 年	2024 年
3	公共建設局	偉龍馬路公共房屋建造工程	4,307,233.33	2017 年	2025 年
4	海事及水務局	石排灣水庫擴容整治	402,000.00	2018 年	2027 年

31. 截至 2024 年第三季度預算使用率為零的項目共有 14 個，其中有 4 個是在第三季度新登錄的項目(環境保護局占 2 個；公共建設局和衛生局各占 1 個)，涉及經核准預算 1.6 億元(詳細資料可參閱附件三)：

建議部門	第三季度	第二季度
公共建設局	2	3
行政公職局	2	2
身份證明局	2	2
環境保護局	2	1



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

建議部門	第三季度	第二季度
文化局	1	4
澳門大學	1	4
澳門保安部隊事務局	1	2
民航局	1	1
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	1	1
衛生局	1	0
財政局	0	4
市政署	0	1
警察總局	0	1
合計	14	26

32. 在 14 個預算使用率為零的項目中，其中公共建設局、行政公職局、身份證明局和環境保護局各占 2 個，另外，其餘 6 個部門各占 1 個。
33. 經分析 2024 年第三季度「投資計劃」項目的資料，以及將當中的 241 個項目與 2024 年第二季度「投資計劃」項目作比較後，發現政府對其中 10 個項目的執行期作出修改，其中分別有 5 個為推遲預計完成日期和 5 個為將預計完成日期提前的項目。有關原因可參閱本報告書第 13 及 15 點的政府回覆，以及本報告書附件四。
34. 經比較 2024 年第三季度和 2024 年第二季度「投資計劃」項目的最新估算金額，發現有 35 個項目的最新估算金額有所增加，



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

156 個項目的金額沒有變動，40 個項目的金額則有所減少，此外，有 1 個項目的預算從概算金額調整為估算金額。

35. 值得一提的是，將 2024 年第三季度和 2024 年第二季度「投資計劃」項目的最新估算金額作比較後，整體預算金額變動超過 1 億元的項目有如下 7 個。有關變動原因，可參閱本報告書第 17、19 及 21 點的政府回覆：

百萬澳門元

序號	建議部門	項目名稱	第三季度項目 最新估算金額	第二季度項目 最新估算金額	變動
1	公共建設局	大潭山隧道	2,147	97	2,050
2	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	703	437	266
3	房屋局	新城 A 區 B5 地段公共房屋 建造工程	1,381	1,654	-273
4	房屋局	新城 A 區 B11 地段公共房屋 建造工程	1,019	1,492	-473
5	房屋局	新城 A 區 B12 地段公共房屋 建造工程	1,023	1,630	-607
6	房屋局	新城 A 區 B7 地段公共房屋 建造工程	1,830	2,879	-1,049
7	房屋局	新城 A 區 B8 地段公共房屋 建造工程	2,037	3,324	-1,286

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

四、意見和建議

36. 截至 2024 年第三季度「投資計劃」的預算執行率達 70.5%，而預算使用率為 93.4%，整體進度尚算理想，委員會對此表示肯定。
37. 政府提供的項目資料的準確性較以往改善，惟仍有小部分資料出現輸入錯誤的情況，委員會認為應進一步加強有關資料的審查工作。

五、總結

38. 委員會總結如下：

- (1) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- (2) 將本報告書送交特區政府。

二零二五年六月十八日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

葉兆佳
(秘書)

陳澤武

邱庭彪

龐川

林倫偉

梁鴻細

黃
心
軍
理



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

張健中

羅彩燕

李良汪

附件一

行政當局投資與發展開支計劃

二零二四財政年度第三季度

預算執行報告

1
江
林
早
心
軍
夏
卜
理

行政當局投資與發展開支計劃 二零二四財政年度第三季度 預算執行報告



二零二四年十月
財政局

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二四年第三季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

第一部份

二零二四年「投資計劃」的最初預算為澳門元 174 億 1,829 萬元，經核准預算為澳門元 181 億 7,541 萬元，實際開支為澳門元 128 億 1,493 萬元，預算執行率為 70.5%¹，預留金額為澳門元 169 億 7,745 萬元，預算使用率為 93.4%²。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准預算為澳門元 63 億 732 萬元。當中「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」的經核准預算金額最高，為澳門元 7 億 2,055 萬元，預算執行率及使用率分別為 82.6%及 100.0%。其次為「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」，經核准預算為澳門元 6 億 8,093 萬元，預算執行率及使用率分別為 83.3%及 100.0%。


按組織分類分，房屋局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准預算為澳門元 55 億 2,568 萬元，佔整體預算的 30.4%，預算執行率及使用率分別為 84.1%及 99.7%。其次為公共建設局及衛生局，公共建設局的經核准預算為澳門元 52 億 8,164 萬元，佔整體預算的 29.1%，預算執行率及使用率分別為 81.3%及 95.9%；衛生局的經核准預算為澳門元 12 億 9,845 萬元，佔整體預算的 7.1%，預算執行率及使用率分別為 31.8%及 87.5%。

按經濟分類分，「房屋」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 64 億 645 萬元，佔整體預算的 35.2%，預算執行率及使用率分別為 83.9%及 98.9%。當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准預算為澳門元 44 億 6,979 萬元，佔整體預算的 24.6%，預算執行率及使用率分別為 73.1%及 93.8%，主要涉及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

1 實際開支 / 經核准預算


2 預留金額 / 經核准預算

按經濟分類的經核准預算分配

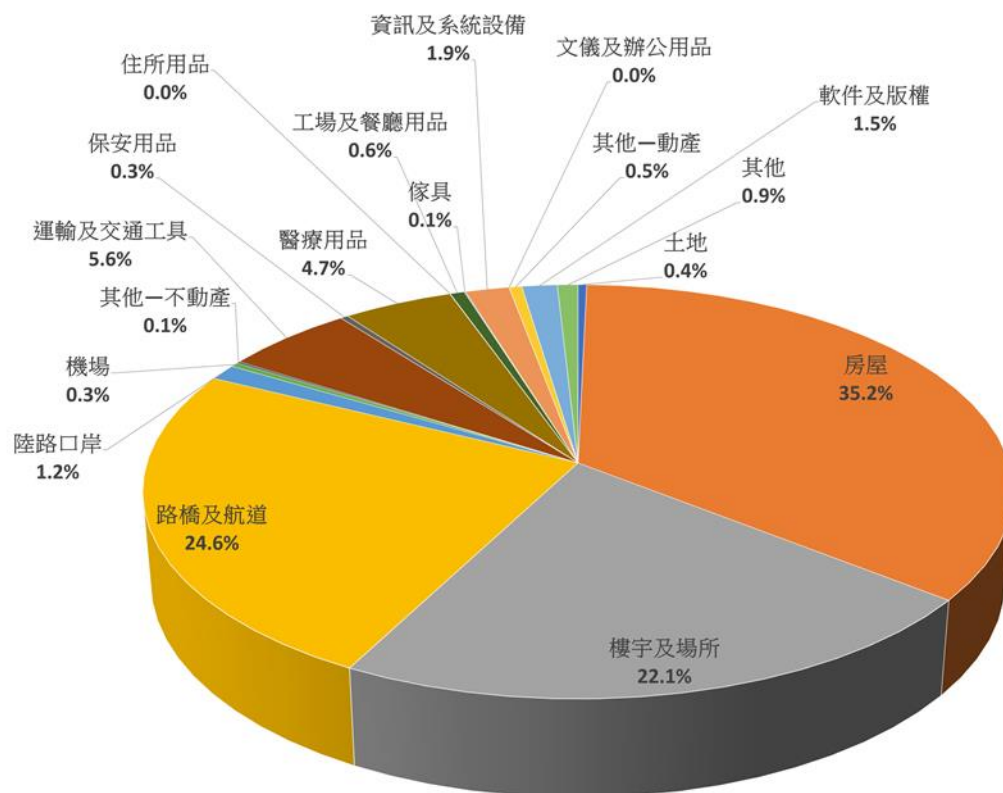

按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 72 億 8,528 萬元，佔整體預算的 40.1%，預算執行率及使用率分別為 72.8%及 92.7%。當中主要包括「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「輕軌東線項目」等項目。其次為「房屋」，其經核准預算為澳門元 58 億 9,135 萬元，佔整體預算的 32.4%，預算執行率及使用率分別為 84.9%及 99.7%，當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。

按功能分類的經核准預算分配

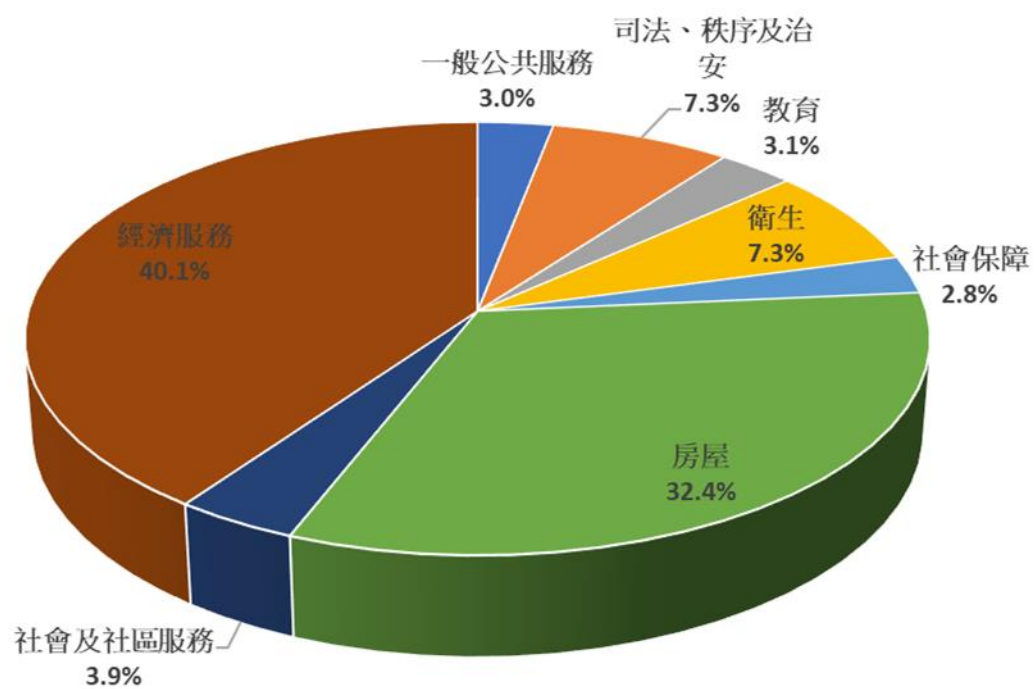

此頁留空

按項目群

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至九月三十日 經核准預算 b
公共設施工程	2,098,534,200.00	2,473,770,800.00
澳門城市集體運輸系統	1,968,157,700.00	1,968,157,700.00
公共房屋	6,307,322,100.00	6,307,322,100.00
路橋、山坡及航道	1,880,067,100.00	1,880,067,100.00
澳門大學橫琴新校園	214,227,800.00	214,227,800.00
部門設施工程	1,344,409,400.00	1,394,579,840.00
部門設備	575,583,200.00	655,627,198.00
公共設施設備	2,574,100.00	2,574,100.00
醫療設備	65,921,000.00	65,921,000.00
新監獄建造	179,409,100.00	181,083,105.68
運輸工具	106,592,000.00	106,592,000.00
建造離島醫療綜合體	1,229,286,900.00	1,229,286,900.00
儲水設施	3,773,900.00	3,773,900.00
智慧雲警務	32,450,000.00	32,450,000.00
新城填海區 A 區建造	1,409,980,600.00	1,659,980,600.00
總額	17,418,289,100.00	18,175,414,143.68

按項目群

(單位：澳門元)

二零二四年 截至九月三十日 實際開支 c	二零二四年 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,434,997,744.68	2,165,475,044.15	58.0	87.5
1,718,232,762.22	1,964,414,612.90	87.3	99.8
5,367,043,507.42	6,234,261,730.67	85.1	98.8
1,268,292,299.11	1,765,717,406.60	67.5	93.9
71,925,702.42	195,779,824.10	33.6	91.4
903,444,355.29	1,173,349,850.33	64.8	84.1
281,753,665.37	540,882,173.84	43.0	82.5
2,574,006.00	2,574,006.00	100.0	100.0
1,203,526.95	51,441,993.80	1.8	78.0
149,832,442.87	179,521,470.45	82.7	99.1
38,888,000.00	106,592,000.00	36.5	100.0
391,111,346.67	1,048,206,255.18	31.8	85.3
3,317,567.53	3,719,527.53	87.9	98.6
0.00	30,807,863.00	0.0	94.9
1,182,313,355.69	1,514,707,579.41	71.2	91.2
12,814,930,282.22	16,977,451,337.96	70.5	93.4

按組織分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至九月三十日 經核准預算 b
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00
財政局	573,155,300.00	603,839,801.90
身份證明局	34,700,000.00	27,704,000.00
博彩監察協調局	123,776,400.00	192,353,900.00
勞工事務局	0.00	18,878,000.00
行政公職局	303,598,800.00	290,543,280.00
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00
法務局	92,296,800.00	110,129,300.00
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00
交通事務局	76,300,000.00	76,640,116.90
環境保護局	850,000,000.00	917,055,520.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	4,945,004,200.00	5,281,638,405.89
文化局	252,196,700.00	408,896,700.00
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	631,521,098.00
海事及水務局	288,080,000.00	197,788,400.00
懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00
房屋局	5,526,143,800.00	5,525,681,015.31
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00
澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至九月三十日 實際開支 c	二零二四年 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
17,583,315.97	46,361,263.47	32.9	86.8
417,769,297.20	529,767,883.44	69.2	87.7
0.00	6,703,125.00	0.0	24.2
99,433,292.94	191,309,915.51	51.7	99.5
5,946,184.80	14,667,962.00	31.5	77.7
94,532,279.00	153,233,551.70	32.5	52.7
8,907,978.86	8,907,978.86	99.0	99.0
26,251,118.60	100,314,111.00	23.8	91.1
0.00	2,866,800.00	0.0	78.5
10,771,431.35	49,676,401.75	14.1	64.8
716,108,435.89	887,541,176.71	78.1	96.8
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
4,293,190,281.48	5,066,661,633.10	81.3	95.9
18,808,986.66	197,035,831.12	4.6	48.2
142,030,962.99	181,485,070.76	78.2	99.9
511,934,282.94	620,591,041.87	81.1	98.3
113,494,493.71	189,605,554.73	57.4	95.9
149,832,442.87	179,521,470.45	82.7	99.1
74,329,964.08	159,993,927.95	46.3	99.7
293,900.00	28,672,600.00	1.0	99.6
413,441,307.27	1,136,613,762.83	31.8	87.5
433,608,517.97	454,636,879.89	85.0	89.1
4,648,575,114.79	5,510,704,388.60	84.1	99.7
0.00	7,029,876.66	0.0	11.1
103,393,963.12	200,011,323.52	44.8	86.6
71,925,702.42	195,779,824.10	33.6	91.4
67,533,129.98	89,127,666.66	74.5	98.4
13,239,926.56	23,369,190.20	56.7	100.0
93,422,333.02	147,645,485.19	59.9	94.6

按組織分類

	二零二四年 最初預算	二零二四年 截至九月三十日 經核准預算
	a	b
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00
市政署	673,155,500.00	626,273,500.00
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門 醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00
總額	17,418,289,100.00	18,175,414,143.68

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至九月三十日 實際開支 c	二零二四年 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
5,636,978.29	19,632,982.00	28.2	98.1
261,606,659.46	576,654,658.89	41.8	92.1
0.00	0.00	0.0	0.0
12,814,930,282.22	16,977,451,337.96	70.5	93.4

按經濟分類

	二零二四年 最初預算	二零二四年 截至九月三十日 經核准預算
	a	b
土地	70,811,400.00	66,587,632.65
房屋	6,395,282,400.00	6,406,449,166.67
樓宇及場所	3,683,634,400.00	4,012,014,972.31
路橋及航道	4,548,362,000.00	4,469,789,609.47
陸路口岸	0.00	223,436,600.00
機場	63,168,000.00	63,168,000.00
其他—不動產	35,865,900.00	23,673,620.00
運輸及交通工具	689,735,000.00	1,008,888,624.50
保安用品	59,137,600.00	59,137,600.00
醫療用品	1,012,175,400.00	849,511,689.09
住所用品	3,467,400.00	3,352,240.00
工場及餐廳用品	118,143,700.00	110,600,140.50
傢具	6,689,200.00	9,549,200.00
資訊及系統設備	226,563,500.00	339,425,914.00
文儀及辦公用品	202,800.00	91,090.00
其他—動產	77,029,600.00	98,081,238.41
軟件及版權	289,501,000.00	272,477,277.01
其他	138,519,800.00	159,179,529.07
總額	17,418,289,100.00	18,175,414,143.68

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至九月三十日 實際開支 c	二零二四年 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
45,065,921.01	65,860,334.01	67.7	98.9
5,372,696,900.54	6,333,804,705.67	83.9	98.9
2,574,066,116.75	3,606,011,284.14	64.2	89.9
3,266,267,484.21	4,191,138,058.18	73.1	93.8
148,315,467.81	219,054,848.39	66.4	98.0
0.00	7,029,876.66	0.0	11.1
5,815,117.53	15,403,341.53	24.6	65.1
886,027,276.21	1,008,888,624.50	87.8	100.0
12,018,315.97	52,209,226.47	20.3	88.3
106,885,762.99	679,075,886.19	12.6	79.9
0.00	1,950,970.00	0.0	58.2
50,976,663.30	86,927,424.10	46.1	78.6
825,048.00	7,980,653.00	8.6	83.6
107,576,033.44	233,164,772.45	31.7	68.7
0.00	81,750.00	0.0	89.7
22,604,263.86	83,134,407.67	23.0	84.8
102,803,226.60	229,611,144.00	37.7	84.3
112,986,684.00	156,124,031.00	71.0	98.1
12,814,930,282.22	16,977,451,337.96	70.5	93.4

按功能分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至九月三十日 經核准預算 b
1-00 一般公共服務	500,194,100.00	553,386,140.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	500,194,100.00	553,386,140.00
2-00 司法、秩序及治安	1,094,812,600.00	1,323,882,371.47
2-01 指揮部	20,387,300.00	20,387,300.00
2-02 警察及海關	501,026,700.00	718,557,007.79
2-03 消防	10,500,000.00	9,528,958.00
2-04 民防	3,650,000.00	3,650,000.00
2-05 司法及秩序	379,839,500.00	390,676,000.00
2-06 懲教	179,409,100.00	181,083,105.68
3-00 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
3-02 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
4-00 衛生	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00
4-01 行政、規範及研究	19,670,000.00	19,670,000.00
4-02 醫療服務	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00
5-00 社會保障	510,316,800.00	510,316,800.00
5-02 社會援助	510,316,800.00	510,316,800.00
6-00 房屋	5,891,813,100.00	5,891,350,315.31
6-01 行政、規範及研究	94,807,800.00	94,345,015.31
6-02 公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至九月三十日 實際開支 c	二零二四年 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
387,338,278.79	511,660,469.86	70.0	92.5
387,338,278.79	511,660,469.86	70.0	92.5
854,846,021.85	1,263,456,544.43	64.6	95.4
20,276,850.40	20,276,850.40	99.5	99.5
524,203,058.14	708,365,268.72	73.0	98.6
4,399,998.00	8,399,998.00	46.2	88.2
0.00	2,866,800.00	0.0	78.5
156,133,672.44	344,026,156.86	40.0	88.1
149,832,442.87	179,521,470.45	82.7	99.1
243,146,695.52	513,591,414.28	43.1	91.0
243,146,695.52	513,591,414.28	43.1	91.0
411,270,500.27	1,134,402,955.83	30.8	85.0
11,775,115.30	18,220,283.00	59.9	92.6
399,495,384.97	1,116,182,672.83	30.4	84.8
433,608,517.97	454,636,879.89	85.0	89.1
433,608,517.97	454,636,879.89	85.0	89.1
4,999,073,515.30	5,872,066,316.78	84.9	99.7
65,638,525.85	92,441,466.00	69.6	98.0
4,933,434,989.45	5,779,624,850.78	85.1	99.7

按功能分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至九月三十日 經核准預算 b
7-00 社會及社區服務	604,599,600.00	711,299,600.00
7-01 文化	252,196,700.00	408,896,700.00
7-02 體育及康樂	343,402,900.00	293,402,900.00
7-04 氣象及地球物理	9,000,000.00	9,000,000.00
8-00 經濟服務	6,916,656,400.00	7,285,282,416.90
8-01 行政、規範及研究	123,776,400.00	192,353,900.00
8-04 基礎設施	1,769,919,900.00	1,984,424,987.73
8-05 運輸	3,758,839,600.00	3,792,394,567.27
8-10 環保	849,464,000.00	915,019,520.00
8-11 商業及工業	0.00	2,491,600.00
8-12 科學技術	303,598,800.00	290,543,280.00
8-99 其他	111,057,700.00	108,054,561.90
總額	17,418,289,100.00	18,175,414,143.68

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至九月三十日 實際開支 c	二零二四年 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
180,195,815.67	471,229,441.73	25.3	66.2
18,808,986.66	197,035,831.12	4.6	48.2
152,478,850.15	265,285,631.75	52.0	90.4
8,907,978.86	8,907,978.86	99.0	99.0
5,305,450,936.85	6,756,407,315.16	72.8	92.7
99,433,292.94	191,309,915.51	51.7	99.5
1,450,881,497.86	1,824,911,459.77	73.1	92.0
2,875,598,681.70	3,628,868,236.64	75.8	95.7
716,108,435.89	886,541,176.71	78.3	96.9
1,282,000.00	1,282,000.00	51.5	51.5
94,532,279.00	153,233,551.70	32.5	52.7
67,614,749.46	70,260,974.83	62.6	65.0
12,814,930,282.22	16,977,451,337.96	70.5	93.4

附件二

二零二四財政年度第三季度 「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

1. 署
2. 局
3. 處
4. 處
5. 處
6. 處
7. 處
8. 處
9. 處
10. 處
11. 處
12. 處
13. 處
14. 處
15. 處
16. 處
17. 處
18. 處
19. 處
20. 處
21. 處
22. 處
23. 處
24. 處
25. 處
26. 處
27. 處
28. 處
29. 處
30. 處
31. 處
32. 處
33. 處
34. 處
35. 處
36. 處
37. 處
38. 處
39. 處
40. 處
41. 處
42. 處
43. 處
44. 處
45. 處
46. 處
47. 處
48. 處
49. 處
50. 處
51. 處
52. 處
53. 處
54. 處
55. 處
56. 處
57. 處
58. 處
59. 處
60. 處
61. 處
62. 處
63. 處
64. 處
65. 處
66. 處
67. 處
68. 處
69. 處
70. 處
71. 處
72. 處
73. 處
74. 處
75. 處
76. 處
77. 處
78. 處
79. 處
80. 處
81. 處
82. 處
83. 處
84. 處
85. 處
86. 處
87. 處
88. 處
89. 處
90. 處
91. 處
92. 處
93. 處
94. 處
95. 處
96. 處
97. 處
98. 處
99. 處
100. 處

附件二

二零二四財政年度第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目 數	預算 使用率為 零的項目
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	-
公共建設局	4,945,004,200.00	5,281,638,405.89	4,293,190,281.48	5,066,661,633.10	81.3%	95.9%	46	2
文化局	252,196,700.00	408,896,700.00	18,808,986.66	197,035,831.12	4.6%	48.2%	11	1
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00	17,583,315.97	46,361,263.47	32.9%	86.8%	6	-
市政署	673,155,500.00	626,273,500.00	261,606,659.46	576,654,658.89	41.8%	92.1%	32	-
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00	-	7,029,876.66	0.0%	11.1%	2	1
交通事務局	76,300,000.00	76,640,116.90	10,771,431.35	49,676,401.75	14.1%	64.8%	3	-
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	8,907,978.86	99.0%	99.0%	1	-
行政公職局	303,598,800.00	290,543,280.00	94,532,279.00	153,233,551.70	32.5%	52.7%	7	2
身份證明局	34,700,000.00	27,704,000.00	-	6,703,125.00	0.0%	24.2%	3	2
房屋局	5,526,143,800.00	5,525,681,015.31	4,648,575,114.79	5,510,704,388.60	84.1%	99.7%	26	-
法務局	92,296,800.00	110,129,300.00	26,251,118.60	100,314,111.00	23.8%	91.1%	2	-
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00	433,608,517.97	454,636,879.89	85.0%	89.1%	1	-
海事及水務局	288,080,000.00	197,788,400.00	113,494,493.71	189,605,554.73	57.4%	95.9%	12	-

1/3

Handwritten signatures and initials.

附件二

二零二四財政年度第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目 數	預算 使用率為 零的項目
財政局	573,155,300.00	603,839,801.90	417,769,297.20	529,767,883.44	69.2%	87.7%	11	-
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00	293,900.00	28,672,600.00	1.0%	99.6%	1	-
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00	93,422,333.02	147,645,485.19	59.9%	94.6%	3	-
勞工事務局	-	18,878,000.00	5,946,184.80	14,667,962.00	31.5%	77.7%	1	-
博彩監察協調局	123,776,400.00	192,353,900.00	99,433,292.94	191,309,915.51	51.7%	99.5%	1	-
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00	5,636,978.29	19,632,982.00	28.2%	98.1%	1	-
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	413,441,307.27	1,136,613,762.83	31.8%	87.5%	12	1
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00	71,925,702.42	195,779,824.10	33.6%	91.4%	17	1
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	631,521,098.00	511,934,282.94	620,591,041.87	81.1%	98.3%	10	1
澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00	67,533,129.98	89,127,666.66	74.5%	98.4%	1	-
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00	74,329,964.08	159,993,927.95	46.3%	99.7%	7	-
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00	103,393,963.12	200,011,323.52	44.8%	86.6%	1	-
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00	13,239,926.56	23,369,190.20	56.7%	100.0%	1	-
環境保護局	850,000,000.00	917,055,520.00	716,108,435.89	887,541,176.71	78.1%	96.8%	16	2

2/3

Handwritten signatures and initials.

附件二

二零二四財政年度第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目 數	預算 使用率為 零的項目
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68	149,832,442.87	179,521,470.45	82.7%	99.1%	1	-
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00	-	2,866,800.00	0.0%	78.5%	2	-
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00	142,030,962.99	181,485,070.76	78.2%	99.9%	2	-
合計	17,418,289,100.00	18,175,414,143.68	12,814,930,282.22	16,977,451,337.96	70.5%	93.4%	241	14

公共建設局和海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局和環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

3/3
梁家榮

附件三

二零二四財政年度第三季度

「投資計劃」預算使用率為零的
項目

1 黃
任
村

吳

王

李

張

陳

附件三

二零二四財政年度第三季度「投資計劃」預算使用率為零的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	公共建設局	偉龍馬路公共房屋建造工程	5,000,000.00	4,307,233.33
2	公共建設局	氹仔警司處警務大樓 (B T 2 9 B 1 及 B T 2 9 9 B)	-	122,667.79
3	文化局	永福圍活化工程	15,000,000.00	5,000,000.00
4	民航局	機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	63,168,000.00	55,118,000.00
5	行政公職局	災備雲建設工程	28,200,000.00	19,144,480.00
6	行政公職局	電子政務展廳展品	20,000,000.00	980,000.00
7	身份證明局	購買專有雲平台系統	19,200,000.00	18,000,000.00
8	身份證明局	構建身份證明局檔案室	3,000,000.00	3,000,000.00
9	衛生局	新城A區衛生站裝修工程	-	3,955,901.15
10	澳門大學	澳門大學 - S27教職員宿舍建造工程	5,850,000.00	5,850,000.00


1/2


封

附件三

二零二四財政年度第三季度「投資計劃」預算使用率為零的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
11	澳門保安部隊事務局	消防局港珠澳大橋行動站新控制中心建造工程	-	1,128,960.00
12	環境保護局	澳門國家野外站及氣象聯合觀測平台設計建造工程	-	2,000,000.00
13	環境保護局	氹仔北安港廣場太陽能光伏系統設計及建造工程	-	600,000.00
14	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	醫學中心-設施設備	40,000,000.00	40,000,000.00
合計			199,418,000.00	159,207,242.27




附件四

二零二四財政年度第三季度

「投資計劃」 -

執行期變動的項目

(二零二四年第二季度與二零二四年第三季度比較)

黃紅村
吳
七
李
西
王
王

附件四

二零二四財政年度第三季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目
(二零二四年第二季度與二零二四年第三季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第三季度 預計完成日期	第二季度 預計完成日期	變動
1	公共建設局	新城區海底隧道工程	2027年	2024年	3年
2	公共建設局	輕軌顧問、驗證及審查服務	2025年	2024年	1年
3	公共建設局	輕軌澳門半島線-媽閣段	2025年	2024年	1年
4	文化局	永福圍活化工程	2026年	2025年	1年
5	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	2025年	2024年	1年
6	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	2028年	2029年	-1年
7	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	2024年	2025年	-1年
8	環境保護局	林茂海邊大馬路雨水涵箱排水口臨時污水處理設施 建造工程	2024年	2025年	-1年
9	行政公職局	電子政務展廳展品	2024年	2025年	-1年
10	公共建設局	輕軌東線項目	2027年	2031年	-4年

1/1

黃松林
